

1 - 1 河川・排水機場などの被災施設の復旧状況（総括）

令和5年6月末時点

■河川					
管理者	河川名	地区	箇所数	進捗状況	備考
国	千曲川	長沼穂保(復旧)	1	完了	決壊箇所の復旧延長140m
		長沼穂保(強化)	1	完了	上記箇所の上下流 420m
		立ヶ花～村山橋(強化)		別紙進捗状況	立ヶ花～村山橋間のうち実施済区間を除く区間の堤防強化工事
		篠ノ井塩崎(復旧)	1	完了	軻良根古神社付近
		篠ノ井塩崎(強化)	1	完了	川裏側堤防のり面のコンクリート被覆工事完了
県	浅川外9河川(豊野～篠ノ井)		20	完了	
市	高岡川外1河川(若穂、松代)		3	完了	
■排水機場					
管理者	施設名	所在地	箇所数	進捗状況	備考
長野平 土地改良区 (市へ管理 委託)	浅川第一排水機場外2機場 (小布施町～長沼)		3	完了	本稼働
市	小森第一排水機場外4機場 (豊野～篠ノ井)		5	完了	本稼働

1 - 2 千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋）の進捗状況

令和5年6月末時点 2


～みんなでつなぐしなのの川～

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト 河川における主要の対策ロードマップ

「日本の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進



- 【第一段階(復旧)】 災害復旧は令和3年8月出水・令和4年7月出水による被害拡大箇所等を除いて令和3年度までに完了(権限代行含む)並びに大河津分水路などの下流域の整備に応じた河道掘削(立ヶ花狭窄部など)を順次実施
- 【第二段階(復興)】 改良復旧である堤防強化(粘り強い河川堤防構造など)や遊水地、大町ダム等再編事業(容量再編)を完了
- 【第三段階(復興)】 遊水地、河道掘削(立ヶ花狭窄部など)を令和9年度完了

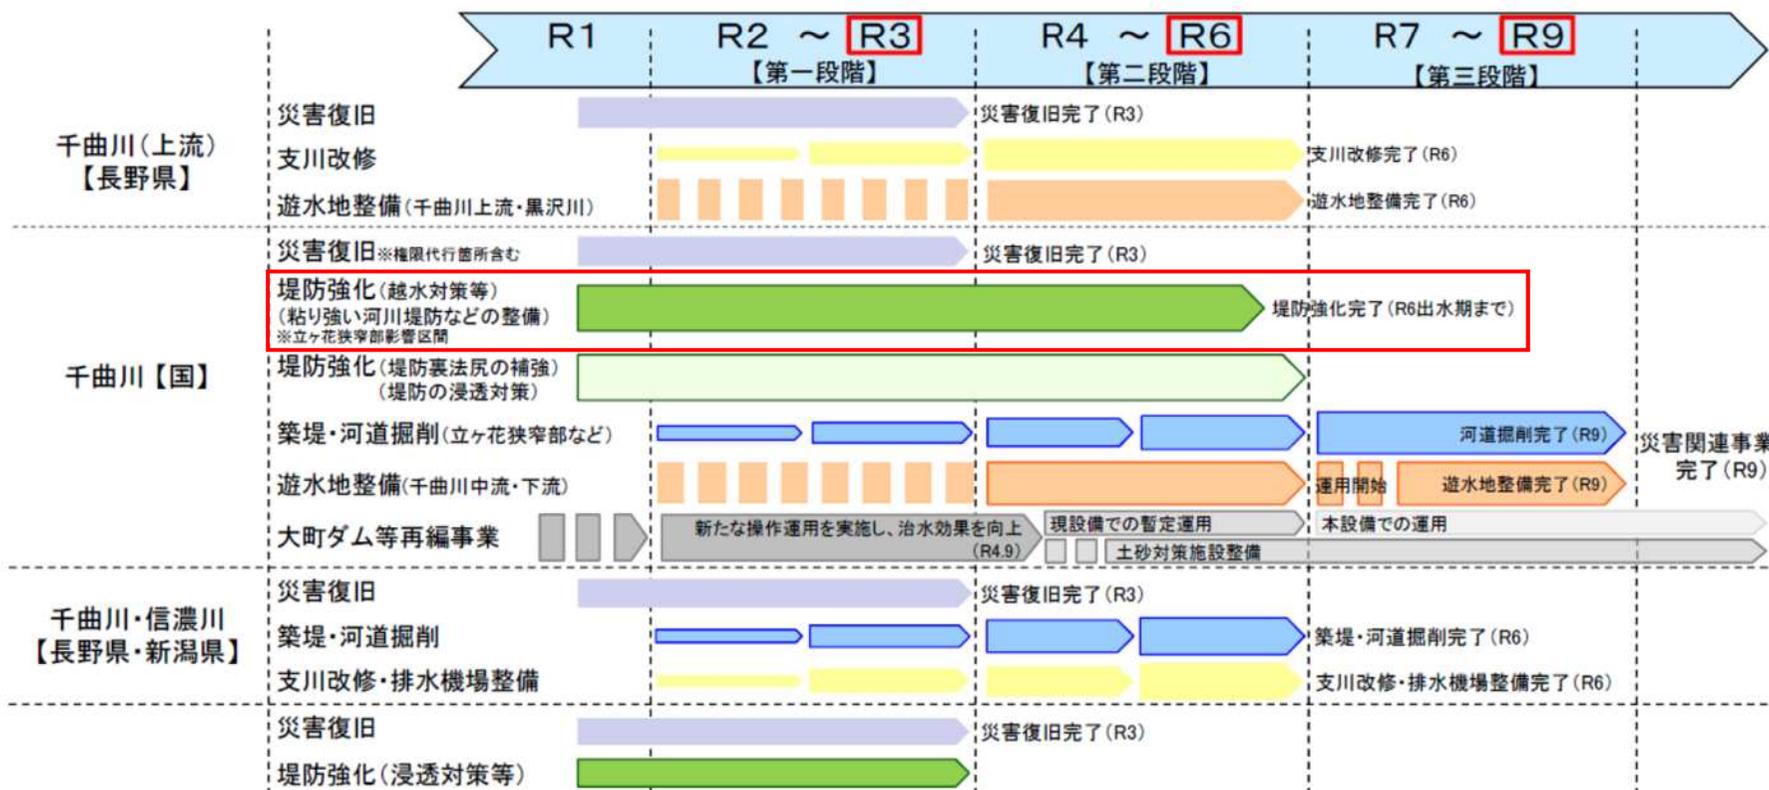

資料提供:千曲川河川事務所

1 - 2千曲川堤防強化 (立ヶ花～村山橋)の進捗状況



■堤防強化工事(左岸)一覧表

記号	工事名	状況	施工箇所	施工延長
左1	千曲川穂保地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	350m・350m
左2	千曲川津野地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	320m・320m
左3	千曲川赤沼地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	300m・440m
左4	赤沼地区堤防強化工事	完了	川表	700m
左5	飯田地区(左岸)堤防強化工事	完了	川表	1,120m
左6	吉島地区堤防強化その1工事	完了	川表	500m
左7	吉島地区堤防強化その2工事	完了	川表	780m
左8	千曲川大町地区堤防強化工事	工事中	川裏	1,040m
左9	赤沼地区堤防強化その1工事	工事中	川裏	380m
左10	赤沼地区堤防強化その2工事	工事中	川裏	420m
左11	飯田地区(左岸)堤防強化その1工事	工事中	川裏	410m
左12	飯田地区(左岸)堤防強化その2工事	工事中	川裏	250m
左13	吉島地区堤防強化その3工事	工事中	川裏	410m
左14	吉島地区堤防強化その4工事	工事中	川裏	430m
左15	吉島地区堤防強化その5工事	工事中	川裏	400m

記号	工事名	状況	施工箇所	施工延長
左16	豊野地区堤防強化その1工事	準備中	川表	230m
左16	豊野地区堤防強化その1工事	準備中	川表	230m
左17	豊野地区堤防強化その2工事	準備中	川表	240m
左18	豊野地区堤防強化その3工事	準備中	川表	240m
左19	千曲川村山地区(左岸)堤防強化その1工事	準備中	川裏	560m
左20	千曲川村山地区(左岸)堤防強化その2工事	準備中	川裏	430m
左21	千曲川大町地区堤防強化その1工事	準備中	川表	920m

R5.6末時点



1 - 2千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋）の進捗状況

<左1>千曲川穂保地区堤防強化工事


【受注者】株式会社 加賀田組
 【場所】長野県長野市穂保地先
 【工期】令和3年7月1日
 ~令和5年1月31日



現在の進捗(令和5年1月末時点)
 ○1月末に工事が完了しました。



現地施工状況①

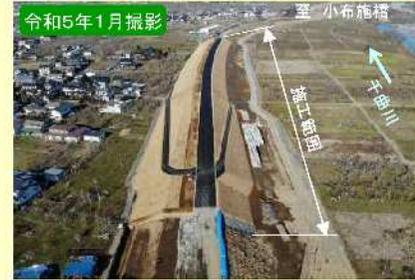

現地施工状況②

<左2>千曲川津野地区堤防強化工事

【受注者】株式会社 浅沼組
 【場所】長野県長野市津野地先
 【工期】令和3年7月1日
 ~令和4年11月30日



現在の進捗(令和4年11月末時点)
 ○11月末に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左3>千曲川赤沼地区堤防強化工事

【受注者】株式会社 植木組
 【場所】長野県長野市赤沼地先
 【工期】令和3年7月1日
 ~令和4年12月23日



現在の進捗(令和4年12月末時点)
 ○12月末に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左4>赤沼地区堤防強化工事

【受注者】中信建設株式会社
 【場所】長野県長野市赤沼地先
 【工期】令和3年7月1日
 ~令和4年8月26日



現在の進捗(令和4年8月末時点)
 ○8月末に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②

1 - 2千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋）の進捗状況

<左5> 飯田地区(左岸)堤防強化工事

【受注者】 藤森建設工業株式会社
 【場所】 長野県上高井郡
 小布施町飯田地先
 【工期】 令和3年7月1日
 ~令和4年9月9日



現在の進捗(令和4年9月末時点)

○9月に工事が完成しました。



現地施工状況①

現地施工状況②

<左6> 吉島地区堤防強化その1工事

【受注者】 株式会社 北條組
 【場所】 長野県上高井郡
 小布施町吉島地先
 【工期】 令和3年7月1日
 ~令和4年8月31日



現在の進捗(令和4年8月末時点)

○8月末に工事が完成しました。



現地施工状況①

現地施工状況②

<左7> 吉島地区堤防強化その2工事

【受注者】 株式会社 北條組
 【場所】 長野県上高井郡
 小布施町吉島地先
 【工期】 令和3年7月1日
 ~令和4年8月31日



現在の進捗(令和4年8月末時点)

○8月末に工事が完成しました。



現地施工状況①

現地施工状況②

<左8> 千曲川大町地区堤防強化工事

【受注者】 株式会社 植木組
 【場所】 長野県長野市大町地先
 【工期】 令和4年9月21日
 ~令和6年1月31日



現在の進捗(令和5年6月末時点)

○大町工区では、引き続き盛土工及び坂路の施工を行っています。
 ○妙笑寺工区では、坂路部盛土の施工を行っています。
 ○天王宮工区では、作業土工及び護岸基礎工を行っていく予定です。



現地施工状況①

現地施工状況②

1 - 2千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋）の進捗状況

<左9> 赤沼地区堤防強化その1工事

【受注者】 藤森建設工業 株式会社
【場所】 長野県長野市 大字赤沼地先
【工期】 令和4年9月21日 ~ 令和5年11月30日

現在の進捗率 (令和5年6月末時点)
 81.8 %

○護岸工(大型連節ブロック張)が完了し上面に盛土工の施工を行っています。8月中旬頃の盛土工・覆土工完了を目指します。



令和5年6月撮影

千曲川 施工範囲 盛土工

現地施工状況①



令和5年6月撮影

千曲川 施工範囲 盛土工 護岸工(大型連節ブロック張)

現地施工状況②

<左10> 赤沼地区堤防強化その2工事

【受注者】 川中島建設 株式会社
【場所】 長野県長野市 大字赤沼地先
【工期】 令和4年9月21日 ~ 令和5年11月30日

現在の進捗率 (令和5年6月末時点)
 70.5 %

○護岸工(大型連節ブロック張)及び天端巻止工が完了し、護岸工の上面に盛土工・覆土工を行っています。



令和5年6月撮影

千曲川 施工範囲

現地施工状況①



令和5年6月撮影

覆土工施工状況

現地施工状況②

<左11> 飯田地区(左岸)堤防強化その1工事

【受注者】 川中島建設 株式会社
【場所】 長野県上高井郡 小布施町飯田地先
【工期】 令和4年9月21日 ~ 令和5年11月30日

現在の進捗率 (令和5年6月末時点)
 71.4 %

○護岸工(大型連節ブロック張)及び天端巻止工が完了し、護岸設置部の上面への盛土工・覆土工を開始しています。



令和5年6月撮影

千曲川 施工範囲 護岸工(大型連節ブロック張)

現地施工状況①



令和5年6月撮影

護岸工施工状況 天端巻止工 護岸工(大型連節ブロック張)

現地施工状況②

<左12> 飯田地区(左岸)堤防強化その2工事

【受注者】 藤森建設工業 株式会社
【場所】 長野県上高井郡 小布施町飯田地先
【工期】 令和4年9月21日 ~ 令和5年9月29日

現在の進捗率 (令和5年6月末時点)
 92.9 %

○完成した護岸工(大型連節ブロック張)の上面に、盛土工・覆土工を施工しています。○今後は、盛土表面に張芝を施工していく予定です。



令和5年6月撮影

千曲川 施工範囲 盛土工・覆土工

現地施工状況①



令和5年6月撮影

小布施橋 施工範囲 盛土工・覆土工

現地施工状況②

1 - 2千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋）の進捗状況

令和5年6月末時点 7

<左13>吉島地区堤防強化その3工事

【受注者】株式会社 北條組
【場所】長野県上高井郡
小布施町吉島地先
【工期】令和4年9月21日
～令和5年11月30日

59.0
%

現在の進捗率
※令和5年6月30日時点

現在の進捗(令和5年6月末時点)

○現在、護岸工(大型連節ブロック張)の施工を小布施橋より下流へ向かって行っています。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左14>吉島地区堤防強化その4工事

【受注者】株式会社 北條組
【場所】長野県上高井郡
小布施町吉島地先
【工期】令和4年9月21日
～令和5年11月30日

66.5
%

現在の進捗率
※令和5年6月30日時点

現在の進捗(令和5年6月末時点)

○護岸工(大型連節ブロック張)を施工しています。また、護岸工完了部の盛土工及び覆土工の施工を行っています。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左15>吉島地区堤防強化その5工事

【受注者】株式会社 北條組
【場所】長野県上高井郡
小布施町吉島地先
【工期】令和4年9月21日
～令和6年3月31日

41.2
%

現在の進捗率
※令和5年6月30日時点

現在の進捗(令和5年6月末時点)

○川裏側、浅川排水機場より下流側の護岸ブロック及び坂路の施工は完了し、現在は張芝工を施工しています。




現地施工状況①



現地施工状況②

●堤防強化の基本構造

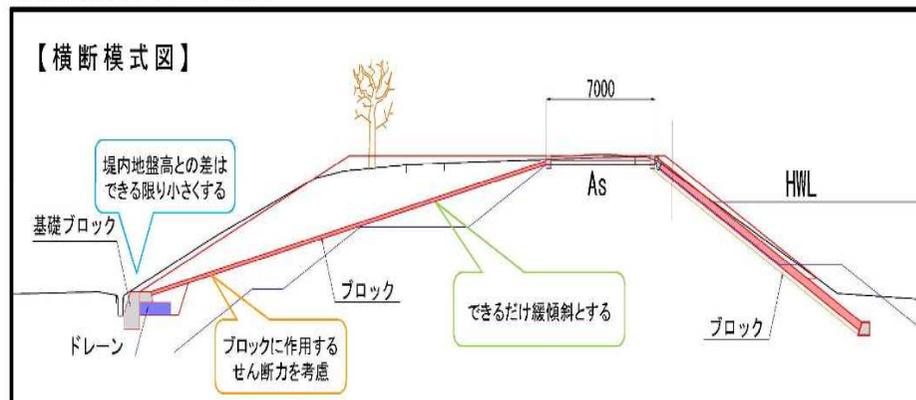

資料提供:千曲川河川事務所

○信濃川水系緊急治水対策プロジェクトでは、令和9年度まで河道掘削(立ヶ花狭窄部)を実施する予定

<緊急治水対策プロジェクト目標>


【R9年度末まで】

令和元年東日本台風における、千曲川本川からの越水等による家屋部の浸水を防止。

立ヶ花狭窄部



上下流バランスを考慮した施工ステップ

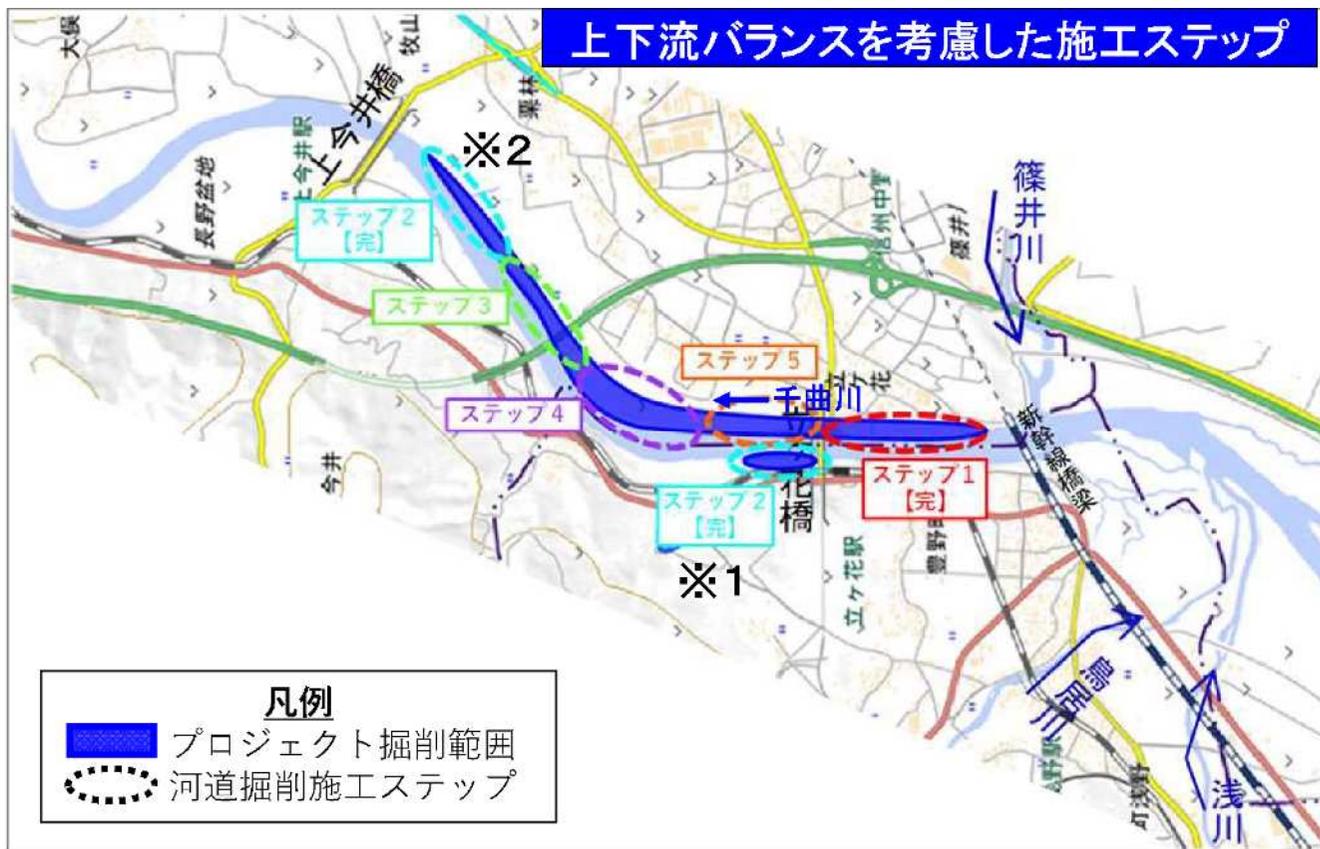

立ヶ花地区河道掘削工事

【受注者】 (株)フクザワ
コーポレーション

【場所】 長野県中野市立ヶ花地先

【工期】 令和3年6月1日
～令和4年3月24日

100
%

現在の進捗率
(令和4年3月31日時点)

ステップ1完成

現在の進捗(令和4年3月末時点)

○令和4年3月に工事完了しました。

右岸52.0kp-100m付近



令和4年3月撮影

千曲川

現地施工状況①

右岸52.0kp-100m付近



令和4年3月撮影

千曲川

現地施工状況②

北陸新幹線橋梁



着手前: 令和2年2月撮影

千曲川

着手前

北陸新幹線橋梁



ステップ1完成後: 令和4年3月撮影

千曲川

完成後

立ヶ花狭窄部河道掘削その1工事

【受注者】 (株)鹿熊組

【場所】 長野県長野市豊野町蟹沢地先
中野市上今井地先

【工期】 令和4年5月27日
～令和5年3月20日

100
%

現在の進捗率
(令和5年3月31日時点)

ステップ2完成

現在の進捗(令和5年3月末時点)

○令和5年3月に工事完了しました。

蟹沢工区 左岸51.5kp付近



着手前: 令和4年7月撮影

千曲川

着手前

蟹沢工区 左岸51.5kp付近



ステップ2完成後: 令和5年3月撮影

千曲川

完成後

上今井南部工区 右岸49.5kp付近



着手前: 令和4年7月撮影

千曲川

着手前

上今井南部工区 右岸49.5kp付近



ステップ2完成後: 令和5年3月撮影

千曲川

完成後

3 遊水地の整備

- 令和元年東日本台風に対する治水対策として、直轄管理区間において、5箇所の遊水地整備を予定。
- 令和9年度までの遊水地事業完成を目指す。



- ・国が整備を進めている中野市の上今井遊水地と千曲市の埴生遊水地の起工式が5月に開催。
- ・塩崎遊水地においては、令和5年度末の整備着手を目指し、用地協議に向けた準備を進め、今年度冬頃より用地交渉を進めていく計画。

4 浅川排水機場の増設

- 浅川排水機場の増設として、県の施工による「(仮称)浅川 第四排水機場」の整備が令和6年末に完成予定。
- 毎秒7 m^3 の排水ポンプ工事を実施中。

