

1 河川・排水機場などの被災施設の復旧状況（総括）

令和7年1月末時点

1

令和6年度 第2回
長野市災害復興本部会議 資料2

■河川

管理者	河川名	地区	箇所数	進捗状況	備考
国	千曲川	長沼穂保(復旧)	1	完了	決壊箇所の復旧延長140m
		長沼穂保(強化)	1	完了	上記箇所の上下流 420m
		立ヶ花～村山橋(強化)		別紙進捗状況	立ヶ花～村山橋間のうち堤防強化実施済区間を除く区間の堤防強化工事
		篠ノ井塩崎(復旧)	1	完了	軻良根古神社付近
		篠ノ井塩崎(強化)	1	完了	川裏側堤防のり面のコンクリート被覆工事完了
県	浅川外9河川(豊野～篠ノ井)		20	完了	
市	高岡川外1河川(若穂、松代)		3	完了	

■排水機場

管理者	施設名	所在地	箇所数	進捗状況	備考
長野平 土地改良区 (市へ管理 委託)	浅川第一排水機場外2機場 (小布施町～長沼)		3	完了	本稼働
市	小森第一排水機場外4機場 (豊野～篠ノ井)		5	完了	本稼働

FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市


2-1 千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋）の進捗状況

令和6年12月末時点

2



●堤防強化の基本構造

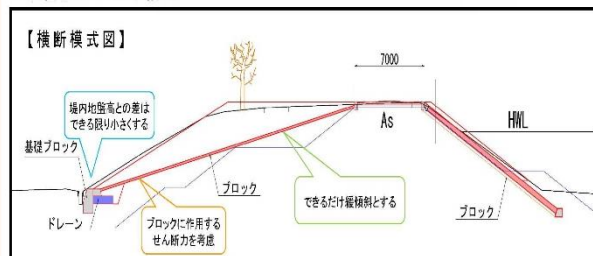

■堤防強化工事(左岸)一覧表

記号	工事名	状況	施工箇所	施工延長
左1	千曲川穂保地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	350m・350m
左2	千曲川津野地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	320m・320m
左3	千曲川赤沼地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	300m・440m
左4	赤沼地区堤防強化工事	完了	川表	700m
左5	飯田地区(左岸)堤防強化工事	完了	川表	1,120m
左6	吉島地区堤防強化その1工事	完了	川表	500m
左7	吉島地区堤防強化その2工事	完了	川表	760m
左8	千曲川大町地区堤防強化工事	完了	川裏	1,020m
左9	赤沼地区堤防強化その1工事	完了	川裏	380m
左10	赤沼地区堤防強化その2工事	完了	川裏	420m
左11	飯田地区(左岸)堤防強化その1工事	完了	川裏	410m
左12	飯田地区(左岸)堤防強化その2工事	完了	川裏	250m
左13	吉島地区堤防強化その3工事	完了	川裏	410m
左14	吉島地区堤防強化その4工事	完了	川裏	430m
左15	吉島地区堤防強化その5工事	完了	川裏	400m

記号	工事名	状況	施工箇所	施工延長
左16	豊野地区堤防強化その1工事	完了	川表	395m
左17	豊野地区堤防強化その2工事	完了	川表	208m
左18	豊野地区堤防強化その3工事	完了	川表	390m
左19	千曲川村山地区(左岸)堤防強化その1工事	工事中	川表・川裏	480m・560m
左20	千曲川村山地区(左岸)堤防強化その2工事	完了	川表・川裏	430m・430m
左21	千曲川大町地区堤防強化その1工事	工事中	川表	920m

□ : 工事了

R6.12月末時点



FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市

資料提供: 千曲川河川事務所

<左16> 豊野地区堤防強化その1工事

【受注者】 中信建設 株式会社
 【場所】 長野県長野市豊野地先
 【工期】 令和5年7月1日
 ～令和6年11月15日



現在の進捗(令和6年11月末時点)
 ○令和6年11月に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左19> 千曲川村山地区(左岸)堤防強化その1工事

【受注者】 株式会社 加賀田組
 【場所】 長野県長野市村山地先
 【工期】 令和5年4月1日
 ～令和7年3月28日



現在の進捗(令和6年12月末時点)
 ○川表側の施工
 仮設工、工事用道路の撤去、借地箇所の返地作業を行っています。
 ○川裏側の施工
 河川土工：坂路15の盛土を行っています。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左20> 千曲川村山地区(左岸)堤防強化その2工事

【受注者】 株式会社 植木組
 【場所】 長野県長野市村山地先
 【工期】 令和5年4月1日
 ～令和6年12月27日



現在の進捗(令和6年12月末時点)
 ○令和6年度12月末に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左21> 千曲川大町地区堤防強化その1工事

【受注者】 大日本土木 株式会社
 【場所】 長野県長野市大町地先
 【工期】 令和5年3月28日
 ～令和7年3月31日



現在の進捗(令和6年12月末時点)
 ○法覆護岸工、光ケーブル配管工、管理用通路工を進めています。



現地施工状況①



現地施工状況②



- 学識者からなる「千曲川覆土変状要因調査検討委員会」を6月25日設立
- 第2回委員会【現地視察（8月5日）及び検討会議（8月6日）】を開催
 - ・委員会では、覆土変状の原因及びメカニズム等を議論
- 第3回委員会 抜本的対策工法について議論予定
 - ・応急対策で実施した天端の雨水対策（ブルーシート養生など）の効果を確認
 ⇒「天端排水処理」を対策の基本方針とすることが決定


<緊急治水対策プロジェクト目標>

令和元年東日本台風における、千曲川本川からの越水等による家屋部の浸水を防止。

立ヶ花狭窄部



上下流バランスを考慮した施工ステップ

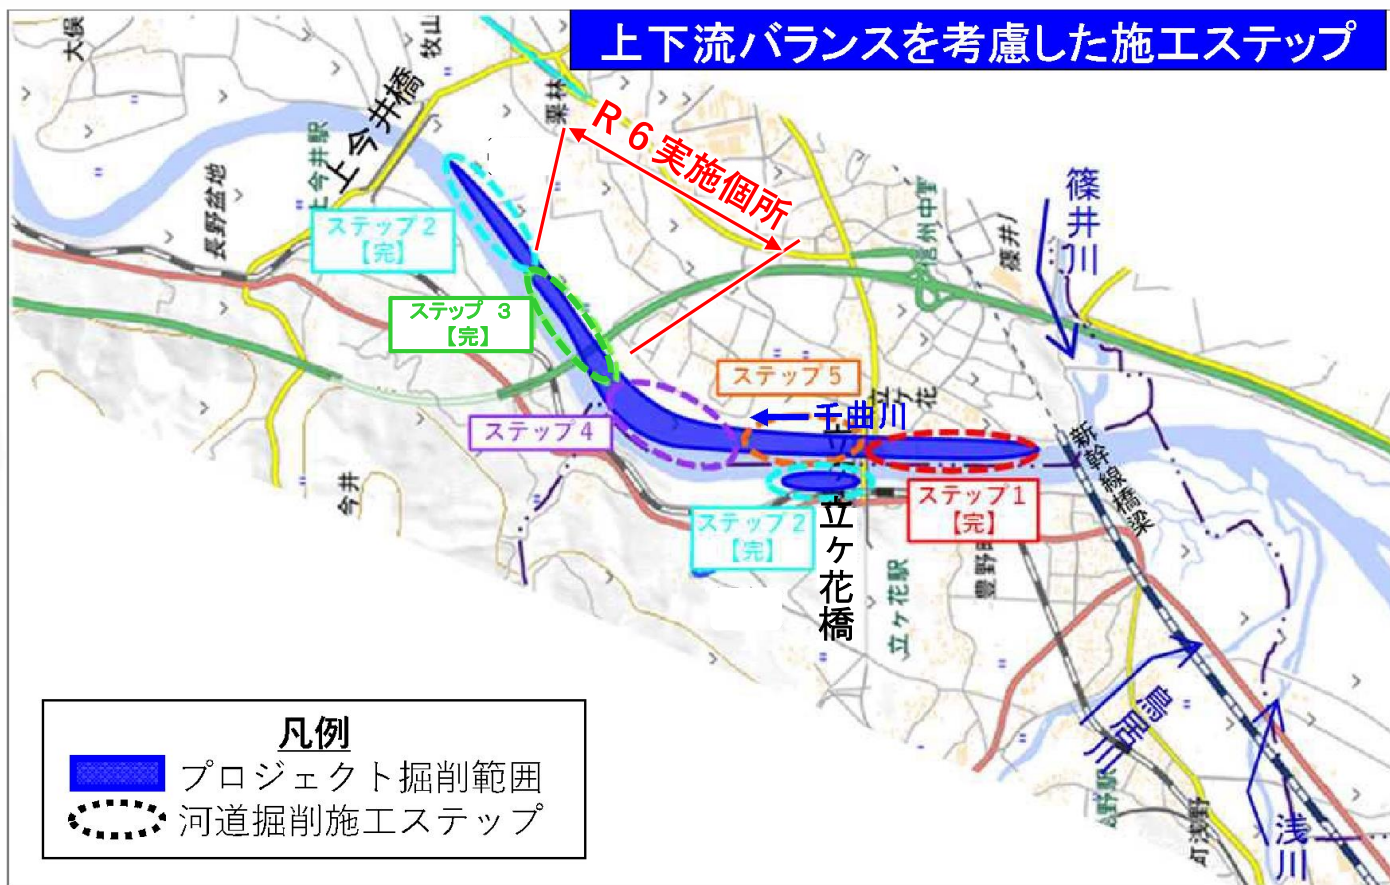

立ヶ花河道掘削その3工事

【受注者】 川中島建設株式会社
 【場 所】 長野県中野市栗林地先
 【工 期】 令和5年11月14日
 ～令和6年9月30日



ステップ3

現在の進捗（令和6年9月末時点）

○令和6年度9月末に工事が完成しました。

千曲川右岸49.5kp付近



着手前

千曲川右岸49.5kp付近



完成後

○ 令和元年東日本台風に対する治水対策として、千曲川の大臣管理区間において5箇所の遊水地を計画



- ・国が整備を進めている中野市の上今井遊水地と千曲市の埴生遊水地において、令和5年5月より排水樋門工事施工中
- ・飯山市の蓮遊水地と千曲市の平和橋遊水地において、工事着手に向けて用地取得等を実施中
- ・塩崎遊水地においては、令和6年10月に3回目の契約・調印会を開催、令和7年度の工事着手に向けて用地取得等を実施中


～みんなでつなぐしなのの川～

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト 河川における主要の対策ロードマップ


「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進



- 【第一段階(復旧)】 災害復旧は令和3年8月出水・令和4年7月出水による被害拡大箇所等を除いて令和3年度までに完了(権限代行含む)並びに大河津分水路などの下流域の整備に応じた河道掘削(立ヶ花狭窄部など)を順次実施
- 【第二段階(復興)】 改良復旧である堤防強化(粘り強い河川堤防構造など)や遊水地、大町ダム等再編事業(容量再編)を完了
- 【第三段階(復興)】 遊水地、河道掘削(立ヶ花狭窄部など)を令和9年度完了

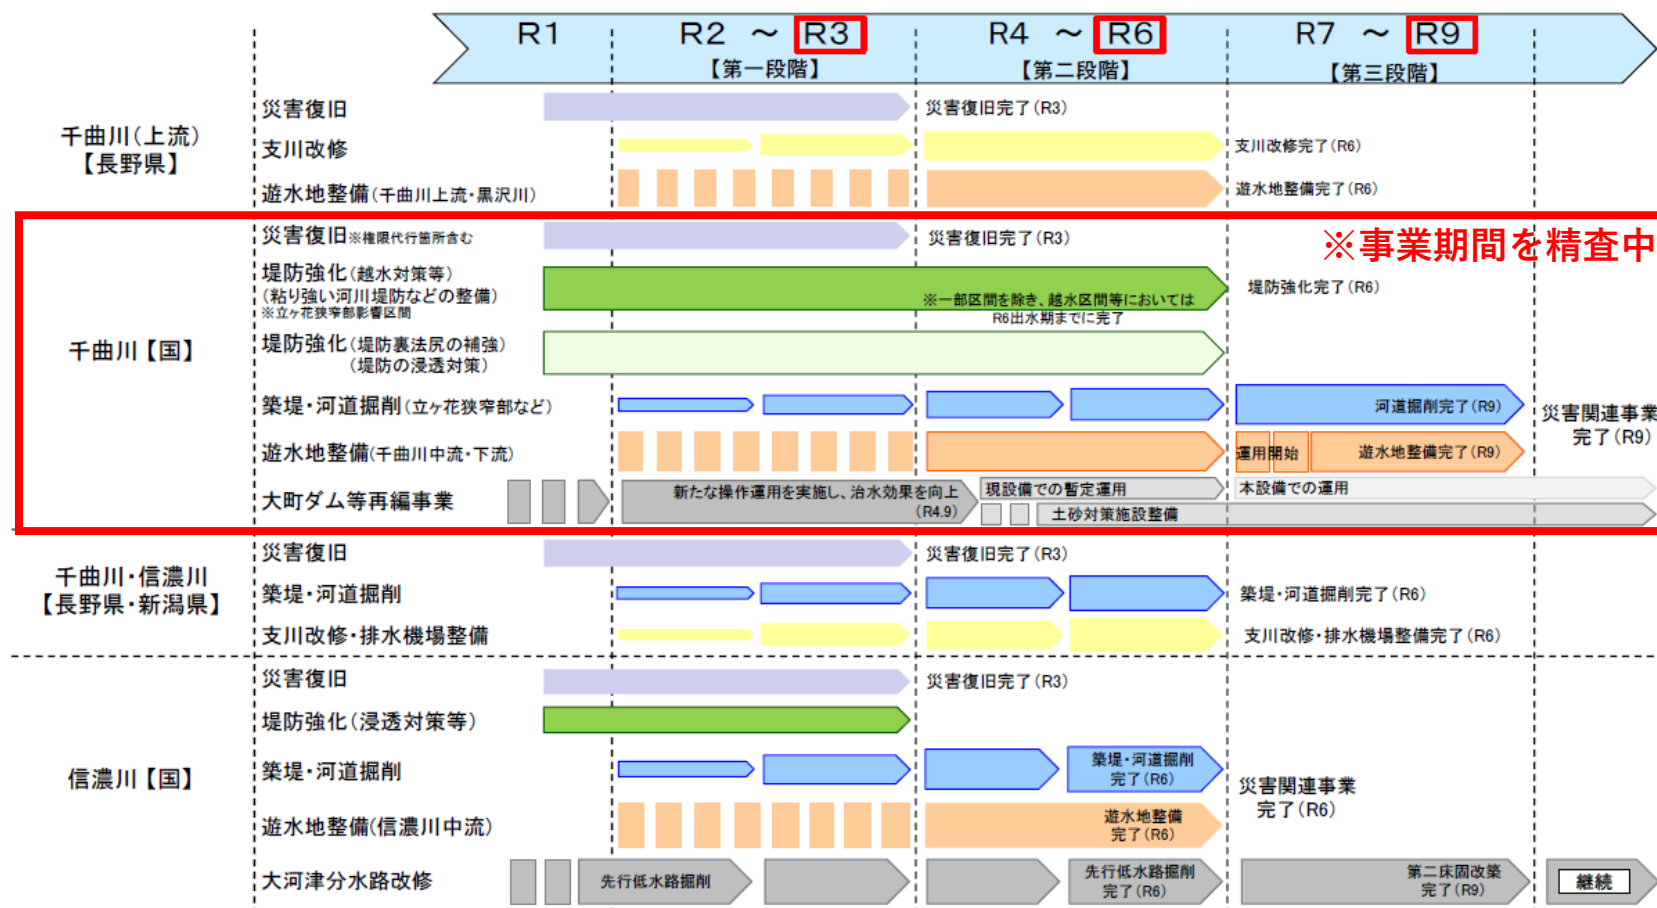

【平面図】

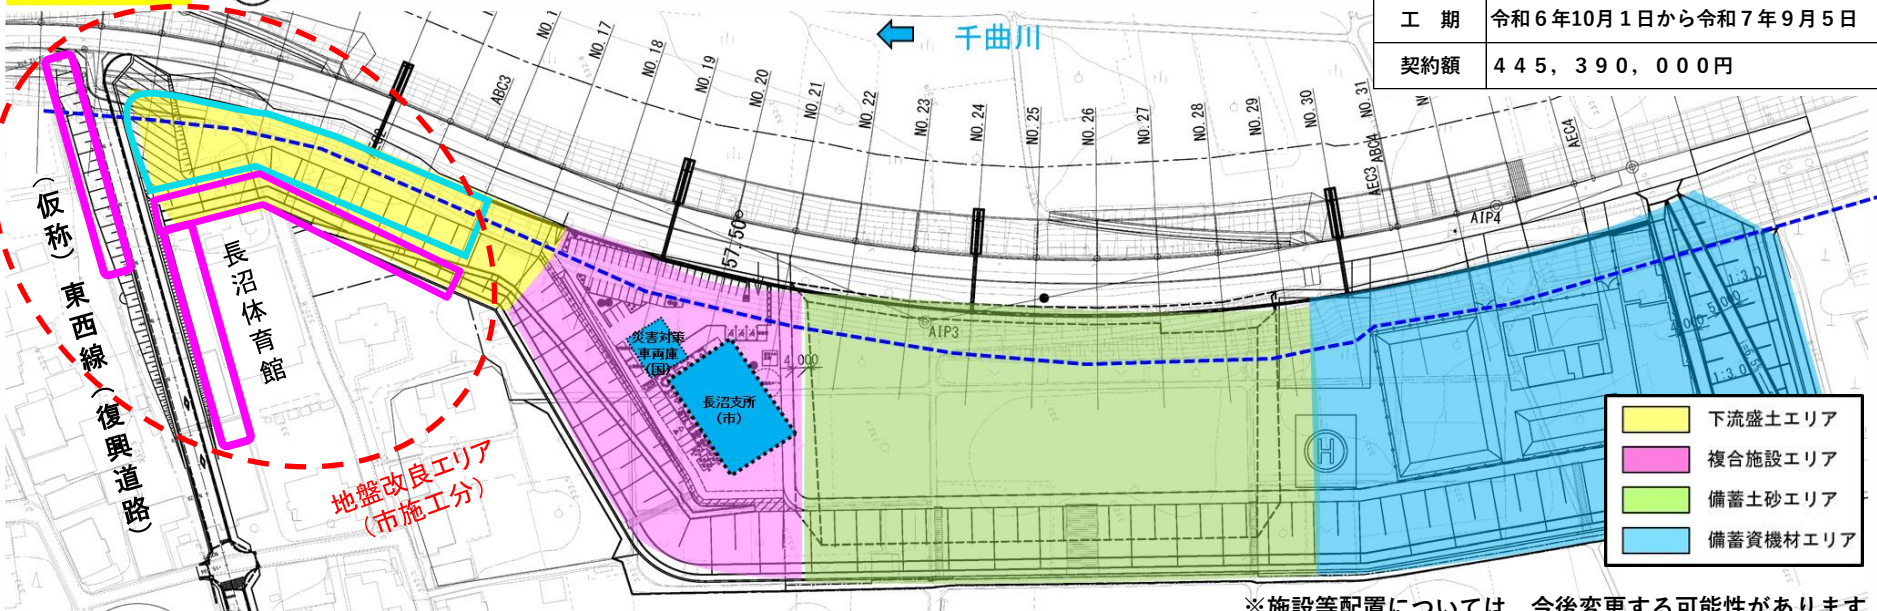

工事概要：①深層混合処理N=654本、②圧密沈下対策 A=5,980㎡

市施工地盤改良範囲

※施設等配置については、今後変更する可能性があります。

【写真：令和7年1月末撮影】



地盤改良工事のイメージ

地盤改良①により
側方変位を抑制



地盤改良①

地盤改良②
排水性を向上し、
圧密を促進

粘性土地盤

千曲川

FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市


○浅川排水機場の増設として、県の施工による「（仮称）浅川 第四排水機場」の整備が令和7年度末に完成予定
 ○毎秒7m³の排水ポンプ工事を実施中（排水機場 建築工事 事実施工中）



写真提供：県浅川改良事務所（令和7年1月28日撮影）



- ① 浅川内水対策事業（県）…図中赤色
- ② 流域対策事業（市）…図中緑色
- ③ 浅川内水対策下流域連絡協議会

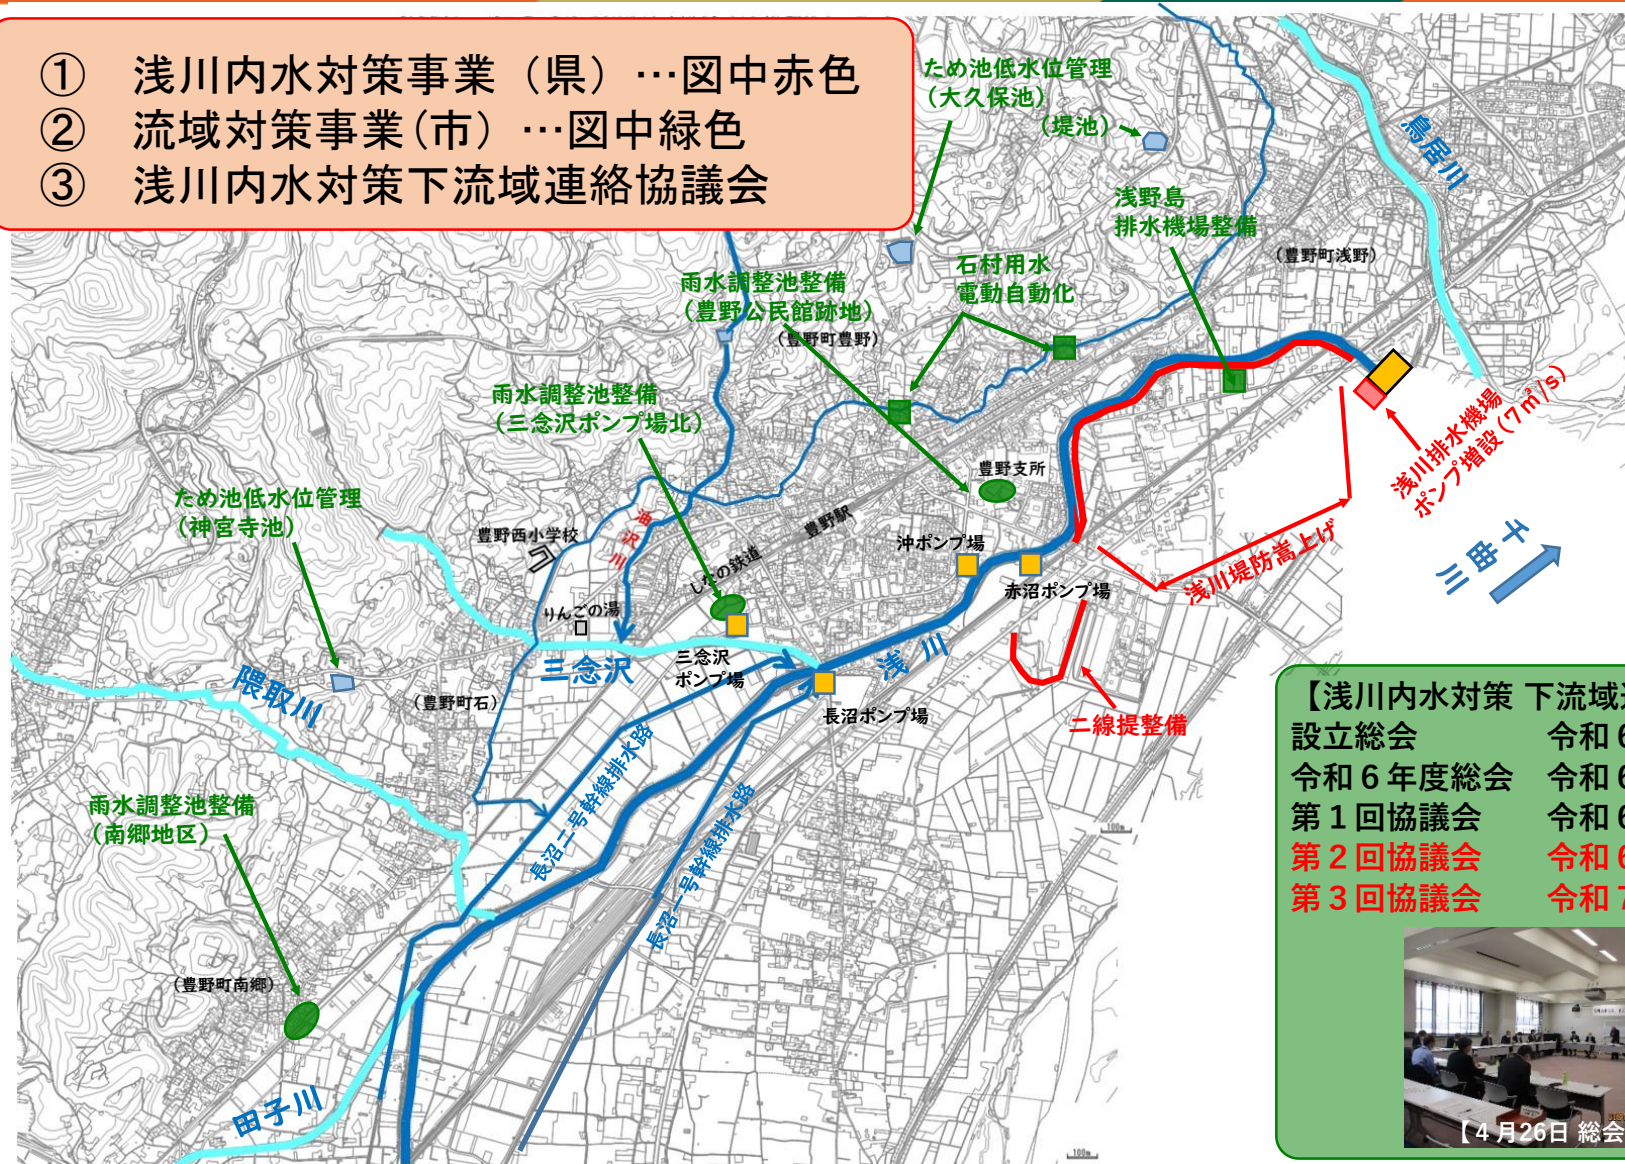

【浅川内水対策 下流域連絡協議会】

設立総会	令和 6 年 1 月 26 日
令和 6 年度総会	令和 6 年 4 月 26 日
第 1 回協議会	令和 6 年 8 月 22 日
第 2 回協議会	令和 6 年 11 月 26 日
第 3 回協議会	令和 7 年 2 月 18 日



【4月26日 総会】
