

1 - 1 河川・排水機場などの被災施設の復旧状況（総括）

令和6年7月末時点

1

■河川

令和6年度 第1回
長野市災害復興計画検討委員会 資料2

建設部河川課

管理者	河川名	地区	箇所数	進捗状況	備考
国	千曲川	長沼穂保(復旧)	1	完了	決壊箇所の復旧延長140m
		長沼穂保(強化)	1	完了	上記箇所の上下流 420m
		立ヶ花～村山橋(強化)		別紙進捗状況	立ヶ花～村山橋間のうち堤防強化実施済区間を除く区間の堤防強化工事
		篠ノ井塩崎(復旧)	1	完了	軻良根古神社付近
		篠ノ井塩崎(強化)	1	完了	川裏側堤防のり面のコンクリート被覆工事完了
県	浅川外9河川(豊野～篠ノ井)		20	完了	
市	高岡川外1河川(若穂、松代)		3	完了	

■排水機場

管理者	施設名	所在地	箇所数	進捗状況	備考
長野平 土地改良区 (市へ管理 委託)	浅川第一排水機場外2機場 (小布施町～長沼)		3	完了	本稼働
市	小森第一排水機場外4機場 (豊野～篠ノ井)		5	完了	本稼働

FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市


1 - 2 千曲川堤防強化 (立ヶ花～村山橋) の進捗状況

令和6年7月末時点

2



●堤防強化の基本構造

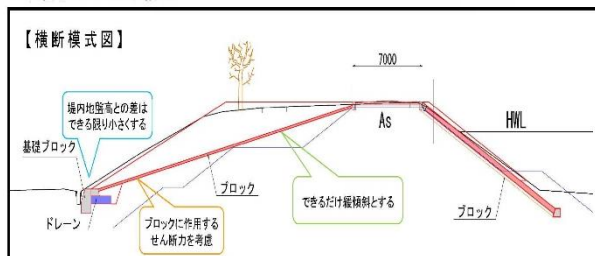


■堤防強化工事(左岸)一覧表

記号	工事名	状況	施工箇所	施工延長
左1	千曲川穂保地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	350m・350m
左2	千曲川津野地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	320m・320m
左3	千曲川赤沼地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	300m・440m
左4	赤沼地区堤防強化工事	完了	川表	700m
左5	飯田地区(左岸)堤防強化工事	完了	川表	1,120m
左6	吉島地区堤防強化その1工事	完了	川表	500m
左7	吉島地区堤防強化その2工事	完了	川表	760m
左8	千曲川大町地区堤防強化工事	完了	川裏	1,020m
左9	赤沼地区堤防強化その1工事	完了	川裏	380m
左10	赤沼地区堤防強化その2工事	完了	川裏	420m
左11	飯田地区(左岸)堤防強化その1工事	完了	川裏	410m
左12	飯田地区(左岸)堤防強化その2工事	完了	川裏	250m
左13	吉島地区堤防強化その3工事	完了	川裏	410m
左14	吉島地区堤防強化その4工事	完了	川裏	430m
左15	吉島地区堤防強化その5工事	完了	川裏	400m

記号	工事名	状況	施工箇所	施工延長
左16	豊野地区堤防強化その1工事	工事中	川表	395m
左17	豊野地区堤防強化その2工事	完了	川表	208m
左18	豊野地区堤防強化その3工事	完了	川表	390m
左19	千曲川村山地区(左岸)堤防強化その1工事	工事中	川表・川裏	480m・560m
左20	千曲川村山地区(左岸)堤防強化その2工事	工事中	川表・川裏	430m・430m
左21	千曲川大町地区堤防強化その1工事	工事中	川表	920m

： 工事了

R6.7月末時点

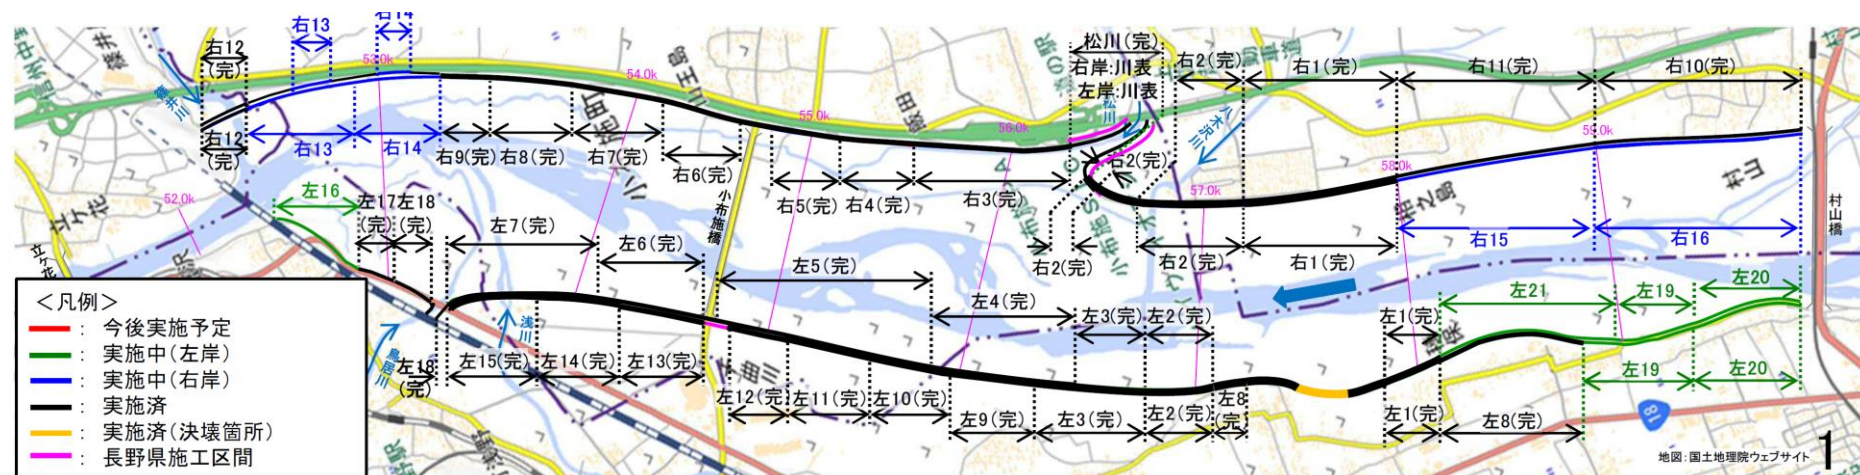

FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市

資料提供: 千曲川河川事務所

1 - 2 千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋）の進捗状況


令和6年7月末時点

3


～みんなでつなぐしなのの川～

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト 河川における主要の対策ロードマップ

「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進



- 【第一段階（復旧）】 災害復旧は令和3年8月出水・令和4年7月出水による被害拡大箇所等を除いて令和3年度までに完了（権限代行含む）並びに大河津分水路などの下流域の整備に応じた河道掘削（立ヶ花狭窄部など）を順次実施
- 【第二段階（復興）】 改良復旧である堤防強化（粘り強い河川堤防構造など）や遊水地、大町ダム等再編事業（容量再編）を完了
- 【第三段階（復興）】 遊水地、河道掘削（立ヶ花狭窄部など）を令和9年度完了

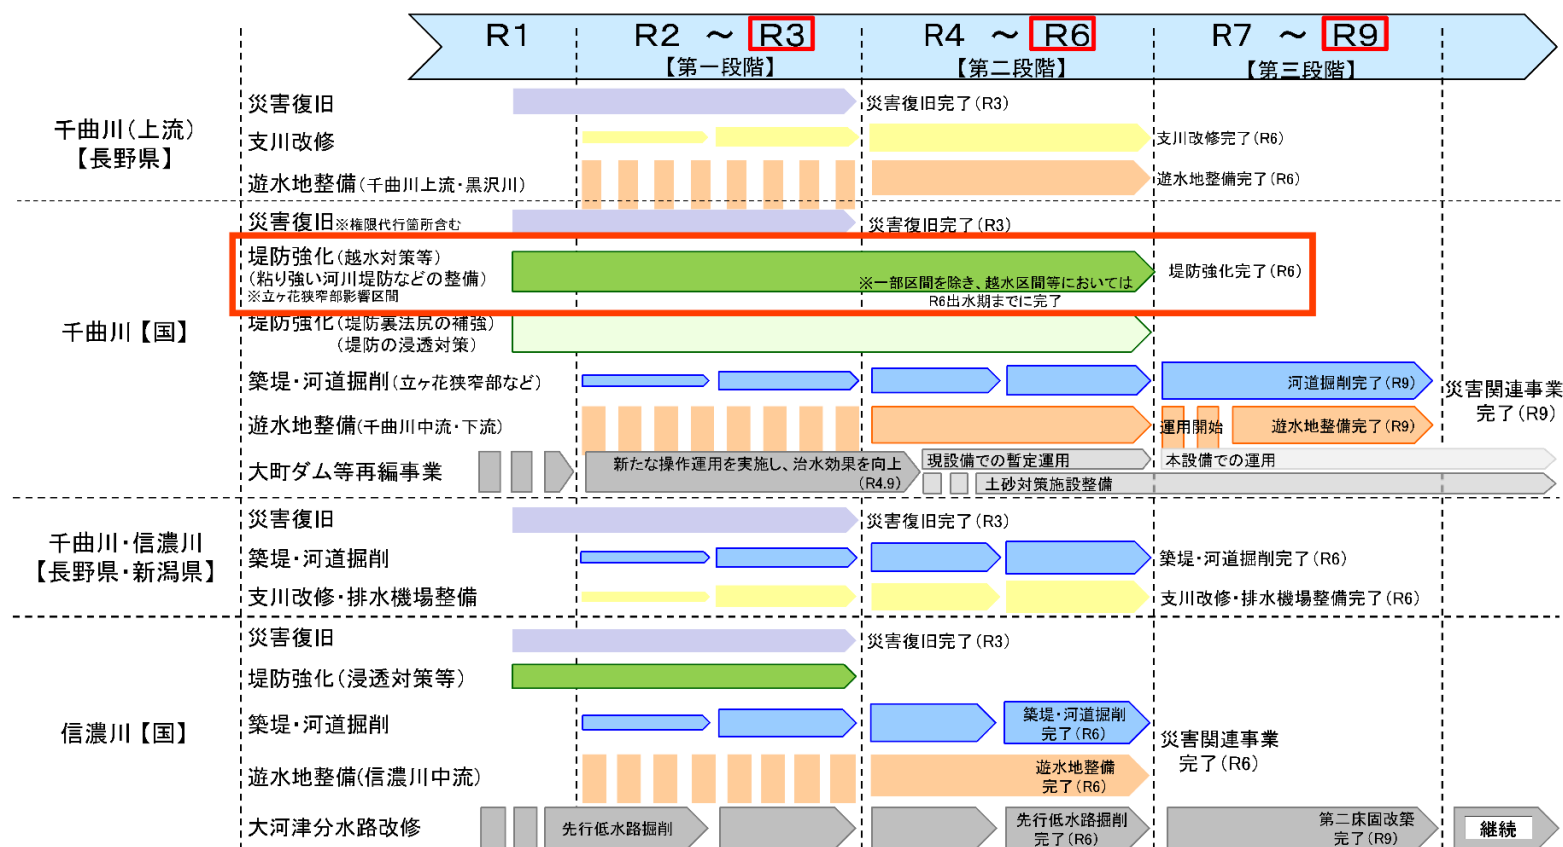

FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市

資料提供: 千曲川河川事務所

1 - 2 千曲川堤防強化 (立ヶ花～村山橋)の進捗状況

令和6年7月末時点

4

<左8> 千曲川大町地区堤防強化工事

【受注者】 株式会社 植木組
【場 所】 長野県長野市大町地先
【工 期】 令和4年9月21日
～令和6年1月31日



現在の進捗(令和6年1月末時点)
○ 令和5年度1月末に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左15> 吉島地区堤防強化その5工事

【受注者】 株式会社 北條組
【場 所】 長野県上高井郡
小布施町吉島地先
【工 期】 令和4年9月21日
～令和6年3月31日



現在の進捗(令和6年3月末時点)
○ 令和5年度3月末に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左16> 豊野地区堤防強化その1工事

【受注者】 中信建設 株式会社
【場 所】 長野県長野市豊野地先
【工 期】 令和5年7月1日
～令和6年11月15日



現在の進捗(令和6年7月末時点)
○ 河川内の高水敷に管理用道路の築造を行っています。
○ 今後は、管理用道路の蟹沢を横断する砂防仮橋を施工する予定です。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左17> 豊野地区堤防強化その2工事

【受注者】 中野土建 株式会社
【場 所】 長野県長野市豊野地先
【工 期】 令和5年4月1日
～令和6年3月29日



現在の進捗(令和6年3月末時点)
○ 令和5年度3月末に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②

FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市

資料提供: 千曲川河川事務所

1 - 2 千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋）の進捗状況

令和6年7月末時点

5

<左18> 豊野地区堤防強化その3工事

【受注者】 中野土建 株式会社
【場 所】 長野県長野市豊野地先
【工 期】 令和5年4月1日
～令和6年7月31日



現在の進捗(令和6年7月末時点)

○令和6年度7月末に工事が完成しました。



現地施工状況



<左19> 千曲川村山地区(左岸)堤防強化その1工事

【受注者】 株式会社 加賀田組
【場 所】 長野県長野市村山地先
【工 期】 令和5年4月1日
～令和6年12月27日



現在の進捗(令和6年7月末時点)

○川表側の施工
河川土工: 坂路の法先ブロック設置及び護岸ブロックに覆土を行っています。
○川裏側の施工
河川土工: 坂路盛土及び法先ブロック設置を行っています。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左20> 千曲川村山地区(左岸)堤防強化その2工事

【受注者】 株式会社 植木組
【場 所】 長野県長野市村山地先
【工 期】 令和5年4月1日
～令和6年12月27日



現在の進捗(令和6年7月末時点)

○川表側の施工
河川土工: 坂路盛土・覆土・法面整形を行っています。
法覆護岸工: 植生工を行っています。
○川裏側の施工
河川土工: 坂路盛土・覆土・法面整形を行っています。
坂路工: 法先ブロック設置を行っています。
法覆護岸工: 植生工を行っています。



現地施工状況①



現地施工状況②

<左21> 千曲川大町地区堤防強化その1工事

【受注者】 大日本土木 株式会社
【場 所】 長野県長野市大町地先
【工 期】 令和5年3月28日
～令和6年9月30日



現在の進捗(令和6年7月末時点)

○覆土工・植生工・管理用通路工の作業を行っています。



現地施工状況①




現地施工状況②

FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市

資料提供: 千曲川河川事務所

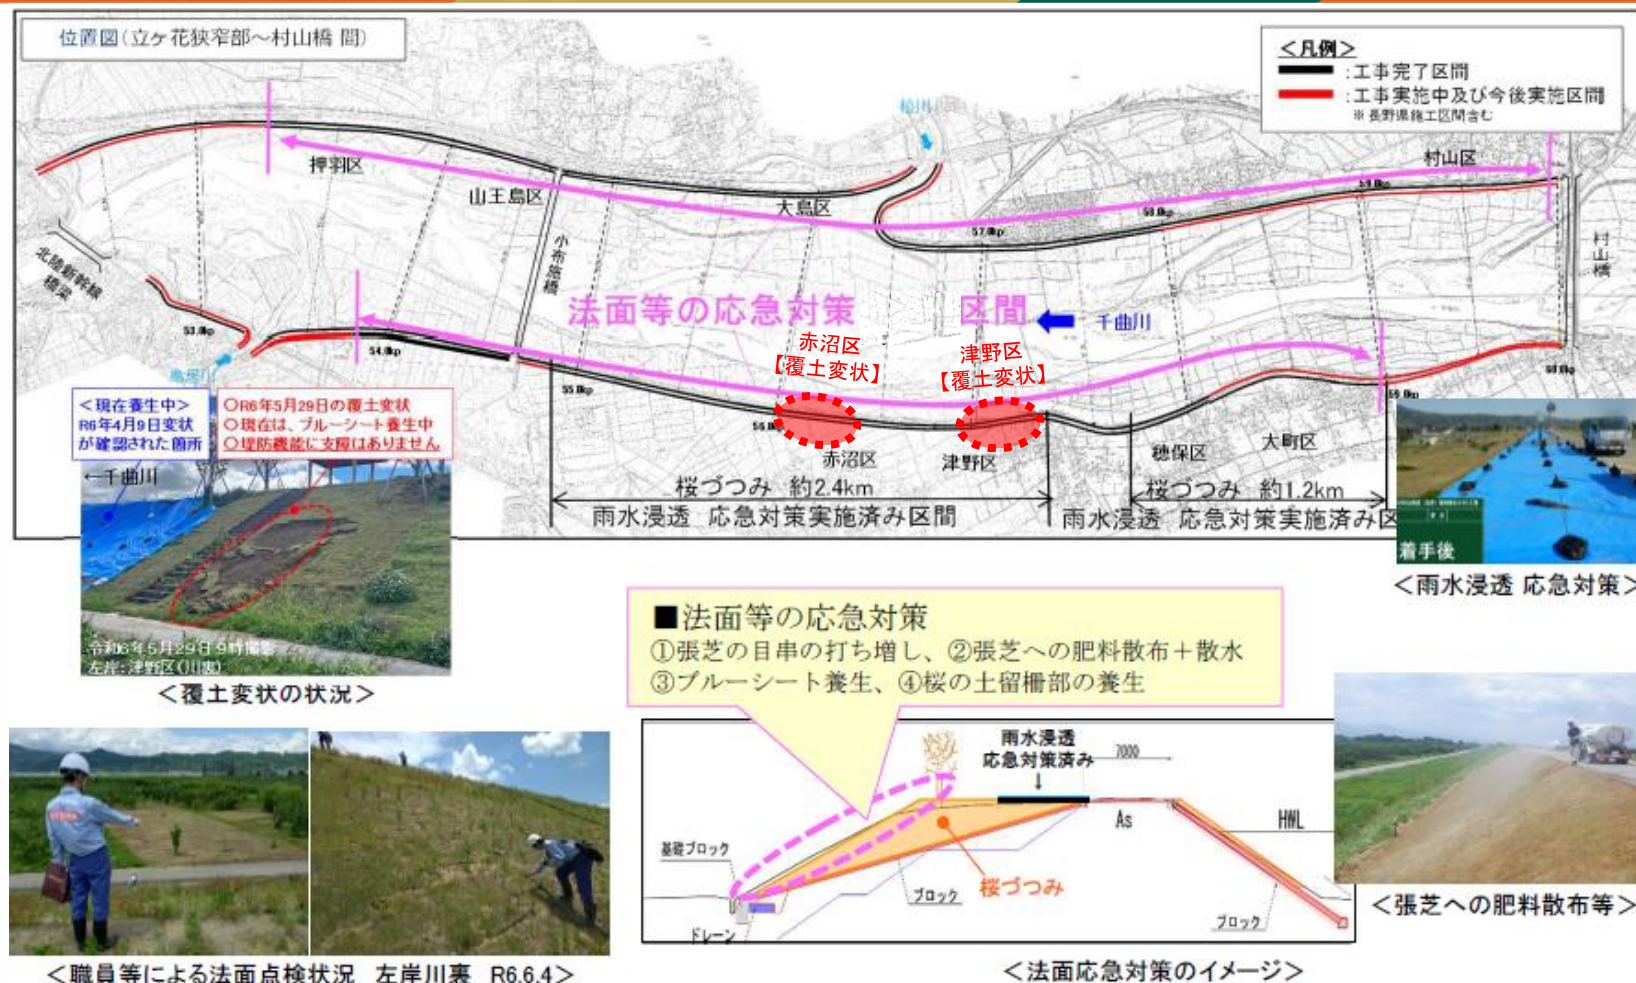

- 学識者からなる「千曲川覆土変状要因調査検討委員会」を6月25日設立
- 第2回委員会【現地視察（8月5日）及び検討会議（8月6日）】を開催
 - ・委員会では、覆土変状の原因及びメカニズム等を議論
- 第3回委員会 抜本的対策工法について議論予定

<緊急治水対策プロジェクト目標>

【R9年度末まで】

令和元年東日本台風における、千曲川本川からの越水等による家屋部の浸水を防止。

立ヶ花狭窄部



上下流バランスを考慮した施工ステップ

