

立ヶ花河道掘削その3工事

【受注者】 川中島建設株式会社
【場 所】 長野県中野市栗林地先
【工 期】 令和5年11月14日
～令和6年9月30日



ステップ3

現在の進捗(令和6年7月末時点)

- 河道掘削作業が概ね完了しました。
- 今後は、仮排水路の撤去及び工事用道路の敷鉄板の撤去を行います。




現地施工状況①



現地施工状況②

【平面図】

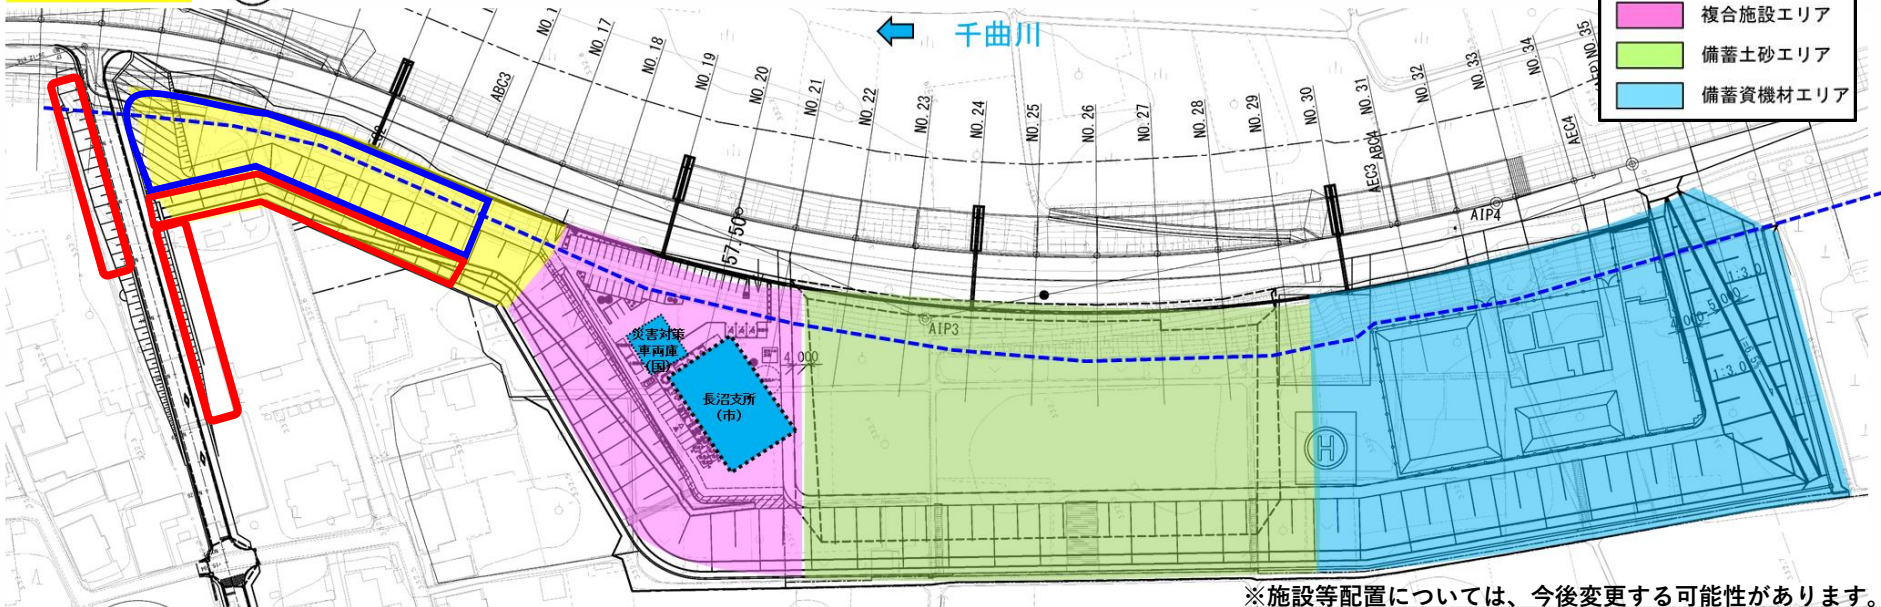

※施設等配置については、今後変更する可能性があります。



・・・市施工 地盤改良範囲

【工事概要（予定）：①深層混合処理N=654本、②圧密沈下対策 A=5,980㎡】

地盤改良工事のイメージ

地盤改良①により
側方変位を抑制



地盤改良①

地盤改良②
排水性を向上し、
圧密を促進

粘性土地盤

千曲川



【現況写真 R6.4月】

地盤改良工事(実施中)
令和6年9月25日撮影



FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市

- 令和元年東日本台風に対する治水対策として、直轄管理区間において、5箇所の遊水地整備を予定。
- 令和9年度までの遊水地整備の完成(令和7年度からの暫定運用開始)を目指します。



- ・国が整備を進めている中野市の上今井遊水地と千曲市の埴生遊水地において、昨年5月より工事施工中。
- ・塩崎遊水地においては、令和6年6月に2回目の契約・調印会を開催し、用地取得を進めています。

- 浅川排水機場の増設として、県の施工による「（仮称）浅川 第四排水機場」の整備が令和6年度末に完成予定。
- 毎秒7m³の排水ポンプ工事を実施中（排水機場 建屋周辺の盛土工事実施中）。





- ① 長沼雨水調整池整備（令和8年度完成予定）
- ② 仁右エ門水門の自動化（令和5年度完成）
- ③ 復興道路に併せて雨水幹線整備
- ④ 防災ステーション周辺に雨水貯留施設

- ① 浅川内水対策事業（県）…図中赤色
- ② 流域対策事業（市）…図中緑色
- ③ 浅川内水対策下流域連絡協議会

