

支所発地域力向上支援金事業実施報告書（自己評価）

令和6年11月30日

事業実施地区	長野市信更町上三水
事業名	「三水仁王尊」景観整備作業
団体名及び 代表者名	(団体名) 三水阿吽の会 (代表者名) 吉澤敦雄 (連絡先)

■事業概要（選考委員会の助言を含む）

遊歩道（10m×1800mm×100mm）コンクリート打設工事	【事業完了日】 令和6年11月16日
	【総事業費】 107,800円
	【補助金額】 100,000円

※活動状況や備品の表示がわかる写真・成果物等を別途添付

■事業効果（目的の達成度・地域への貢献度等について）

周辺住民・阿吽の会々委員多数参加し、作業がスムーズに出来ました。遊歩道が整備され、住民・来訪者が北アルプスの絶景と紅葉を楽しんでいます。
--

※参加人数等、数値化して効果を表せるものがあれば数値化したものも加えて記載をお願いします。

■事業評価（該当欄に○）

	予定を上回る	予定どおり	概ね予定どおり	予定を下回る
事業の内容		○		
事業の効果		○		
特記事項 (評価理由等)				

■今後の取組予定

予定通り遊歩道のコンクリート打設工事が完了しました、今後も遊歩道整備及び周辺の草刈り等周辺住民及び会員の協力を得ながら維持・管理を行って行きます。 ありがとうございました。

工事写真帳

工事名 遊歩道コンクリート打設作業

工事場所 三水仁王尊周辺

2024年11月19日



1

2024/11/9

遊歩道整地



2

2024/11/9

遊歩道整地



3

2024/11/9

遊歩道整地



4

2024/11/9

遊歩道型枠組立



5

2024/11/16

コンクリート運搬



6

2024/11/16

コンクリート打設



7

2024/11/16

コンクリート打設



8

2024/11/16

コンクリート打設



9

2024/11/16

コンクリート打設



10

2024/11/16

コンクリート打設



11

2024/11/16


コンクリート打設



12

2024/11/16

コンクリート打設

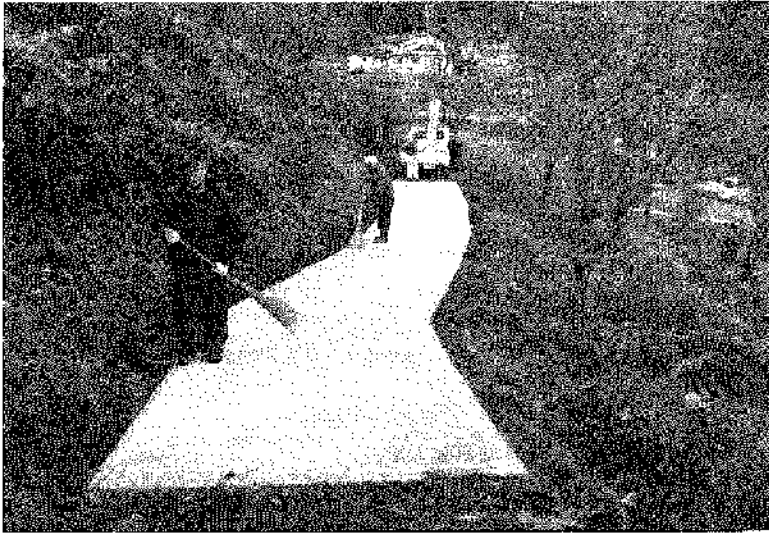


13

2024/11/16

コンクリート打設

完成

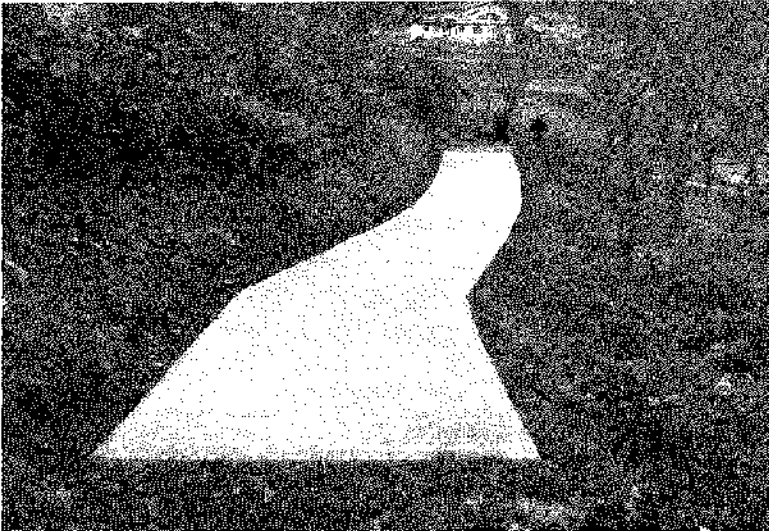


14

2024/11/16

コンクリート打設

完成

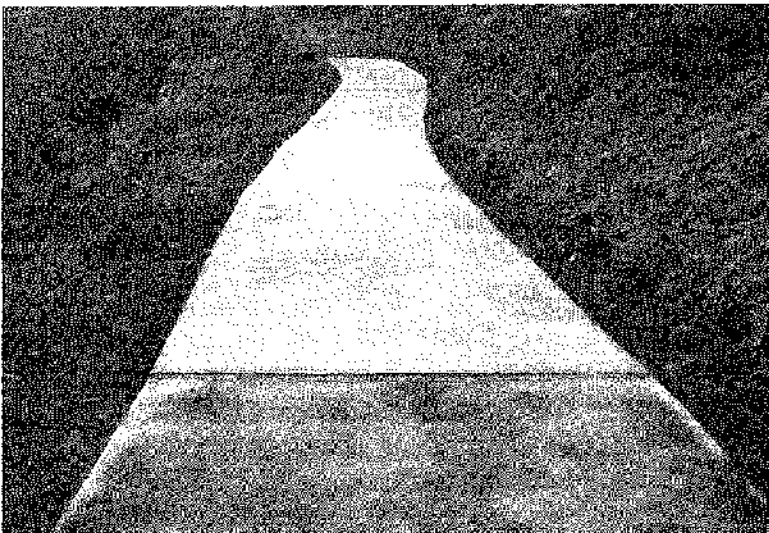

15

2024/11/16

コンクリート打設

完成

支所発地域力向上支援金 事業評価(信更支所)




令和6年12月2日

事業名	三水仁王尊公園景観整備事業
-----	---------------

団体名	三水阿吽の会
-----	--------

評価項目 (選考基準の視点で評価)

事業区分	環境整備活動
------	--------



支所長の総合評価 (次年度以降の活動への助言等)
遊歩道の整備としてコンクリート打設を実施。
整備するにあたり周辺住民・阿吽の会会員多数参加できたことが素晴らしいと思う
当初予定の整備は今年度でできなかったので、継続的な活動を求める
