



河川・排水機場など被災施設の復旧状況

■河川の復旧状況

令和2年8月1日現在

管理者	河川名	地区	箇所数	進捗状況	備考
国	千曲川	長沼(穂保)	1	完了	堤防決壊区間 140m
		長沼(穂保)	1	76%	堤防復旧区間 420m
		篠ノ井塩崎	1	完了	からねこ神社付近
県	浅川	豊野	4	95%~完了	
	三念沢	豊野	1	70%	
	赤野田川	若穂	3	30%~完了	
	保科川	若穂	4	5~25%	
	蛭川	松代	1	完了	
	神田川	松代	1	20%	
	藤沢川	松代	1	5%	
	岡田川	篠ノ井	1	25%	
	聖川	信更	3	5~90%	
	犀川	信更	1	30%	
市	高岡川	若穂	1	0%	1,2,3工区契約済
	唐沢川	若穂	1	完了	
	銅山川	松代	1	50%	

■排水機場・雨水ポンプ場の復旧状況

令和2年8月1日現在

管理者	施設名	所在地	進捗状況(%)	ポンプ能力復旧率	備考
長野平 土地改良区 (市へ管理委託)	浅川第一排水機場	小布施町	10%	7%	R4.3月本稼働
	浅川第二排水機場	小布施町	80%	100%	本稼働
	長沼排水機場	長沼	35%	45%	R3.4月本稼働
市	大道橋排水機場	豊野	100%	100%	本稼働
	赤沼雨水ポンプ場	長沼	20%	100%	R3.3月本稼働
	三念沢雨水ポンプ場	豊野	20%	100%	R3.3月本稼働
	沖雨水ポンプ場	豊野	20%	100%	R3.3月本稼働
	小森第一排水機場	篠ノ井	75%	100%	本稼働

※ポンプ能力復旧率：仮設備による復旧を含めた従前のポンプ能力に対する復旧率

河川の被災状況

○千曲川（長沼穂保）

R元.10月13日

川裏側(宅地側)施工 延長 560m
(川表側はR3.3月末完了)


決壊箇所 (完了)
川表側施工 延長140m

長沼支所





○千曲川(穂保) R2.7月

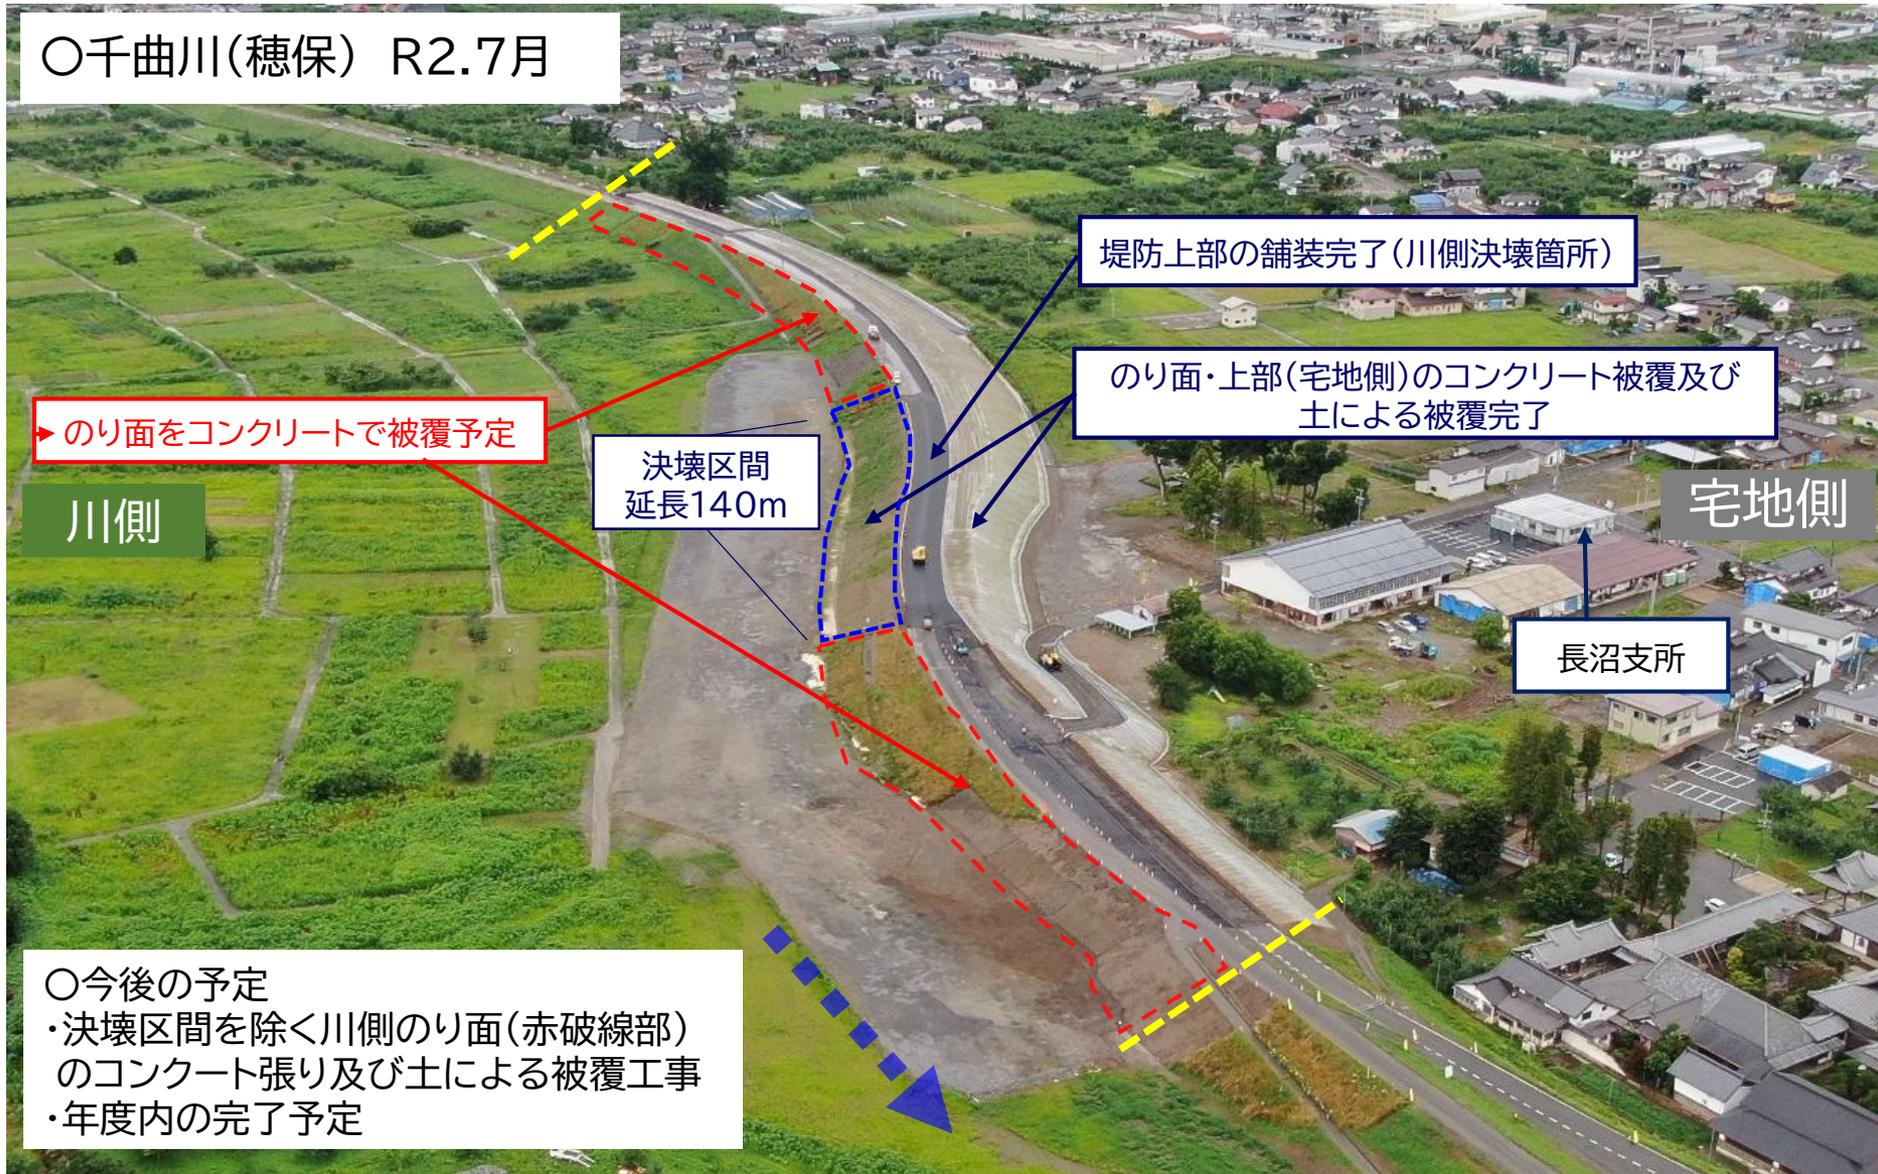

河川の復旧状況(1)－3

○千曲川(穂保)

■のり面 コンクリートブロック設置後、土により被覆中



土による被覆が完了し、緑化されたのり面



■上部 コンクリートブロック設置



土による被覆及びアスファルト舗装



河川の復旧状況(2)

○千曲川（篠ノ井塩崎） 復旧延長 L=688m

R2.5月



○現状

・宅地側のコンクリートによる法尻補強が完了

○今後

・出水期後、川側の法面についてコンクリートによる被覆を今年度中に完了する予定

R2.8月



排水機場・雨水ポンプ場の復旧状況

○浅川第二排水機場



○三念沢雨水ポンプ場



○小森第一排水機場



○沖雨水ポンプ場

