

支所発地域力向上支援金事業実施報告書(自己評価)

令和7年7月18日

事業実施地区	田沢区
事業名	田沢区(軽井沢)公民館駐車場工事
団体名及び 代表者名	(団体名) 田沢区 (代表者名) (連絡先)

■事業概要(選考委員会の助言を含む)

田沢区(軽井沢)公民館の駐車場を整地して碎石を入れて整備をした。 ※補助金額に応じた内容の工事のため、駐車場の約3分の1の面積の整備となった。	【事業完了日】 令和7年7月18日 【総事業費】 100,000円 【補助金額】 100,000円
--	--

※活動状況や備品の表示がわかる写真・成果物等を別途添付

■事業効果(目的の達成度・地域への貢献度等について)

地域の集会等で公民館を使用する際に、駐車場が雨天を中心に泥沼化して車の進入が困難であったが、碎石を入れて整地したため、雨天時でも安心して安全に車輛を入れて駐車ができるようになった。 今回の整備は補助金額の範囲内での工事であったため、駐車場の約3分の1程度の面積の整備に終わり、残る3分の2は未整備として残った。
--

※参加人数等、数値化して効果を表せるものがあれば数値化したものも加えて記載をお願いします。

■事業評価(該当欄に○)

	予定を上回る	予定どおり	概ね予定どおり	予定を下回る
事業の内容			○	
事業の効果			○	
特記事項 (評価理由等)	補助金額の範囲内の工事内容であったため、残る3分の2の広さの工事は、次年度以降の計画で進めていくが今回は、概ね予定通り(駐車場全体の約3分の1の面積を整備)として評価する。			

■今後の取組予定

今回の工事は補助金(10万円)の範囲で実施した広さの整備であったため、駐車場の約3分の2程度が未実施として終わった。次年度以降の予定としては、残りの部分の整備(碎石を入れての整地)を順次進めていく計画である。次年度も支所発地域力向上支援金事業としての補助を希望して進めたい。

令和7年度

長野市支所発地域力向上支援金事業（実施状況を写した写真）

田沢区（軽井沢）公民館駐車場工事

作業前



作業中



作業後



支所発地域力向上支援金 事業評価(信更支所)

令和7年7月24日


事業名	田沢区(軽井沢)公民館駐車場工事
-----	------------------

団体名	田沢区
-----	-----

評価項目(選考基準の視点で評価)

事業区分

教育文化活動

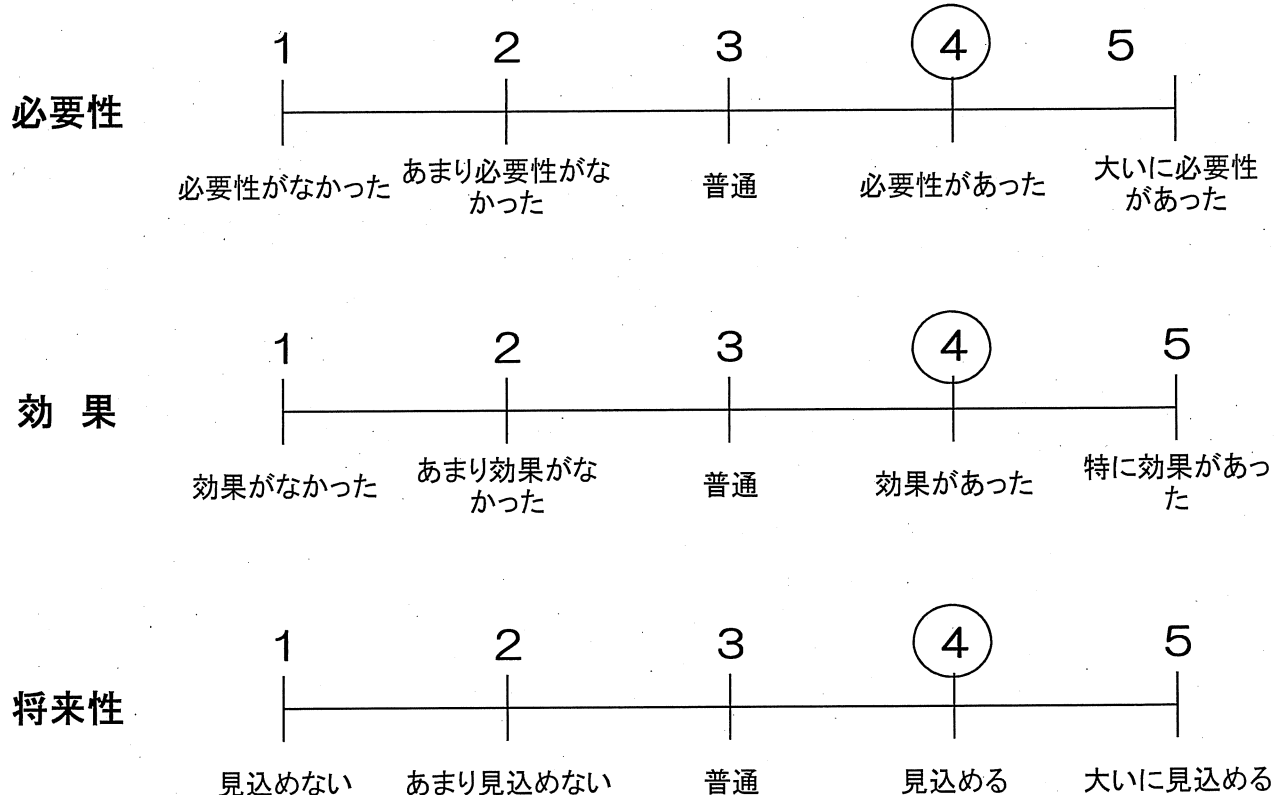

支所長の総合評価(次年度以降の活動への助言等)

地域公民館の駐車場が未整備であったため、雨天時等は車の乗り入れに支障があったが、砕石を入れることで、地域住民が利用しやすくなった。

公民館施設は、地域住民にとって重要な施設であることから、教育及び文化交流の推進が期待できる。

駐車場が整備されたことで、公民館での行事に際し、住民が参加しやすくなったので、地域の良い交流の機会を増やすことも検討してほしい。
