

長野市災害対策本部会議(令和2年3月26日)

部局名:農林部

【対応状況等】

被災農地の排土進捗状況(3月18日現在)

1. 堤内地(住宅地側)

地区	面積 ha	進捗率 %	完了見込	備考
長沼 (豊野の一部を含む)	183	94	4月末 (畑は3月末)	畑の進捗率 99% 水田の進捗率 77%

※長沼支所周辺は公費解体事業と調整しながら、4月以降に着手します。


2. 堤外地(河川敷)

地区	面積 ha	進捗率 %	完了見込	備考	
豊野	338	77	4月末		
長沼		84	4月中旬		
柳原		73	3月末		
朝陽・大豆島				4月末	土砂なし、ゴミ撤去のみ
更北		63	3月末		
若穂		61	4月末		
篠ノ井		69	4月末		
松代		57	4月末		大室・西寺尾の流失農地を除く
平均進捗率			65		


※完了見込みは、1月末までに申請のあった箇所についてのもとなります。

大室・西寺尾は測量が完了し、早急に地元および河川管理者と調整します。

# 長沼地区堤内排土進捗状況 (3月18日現在)

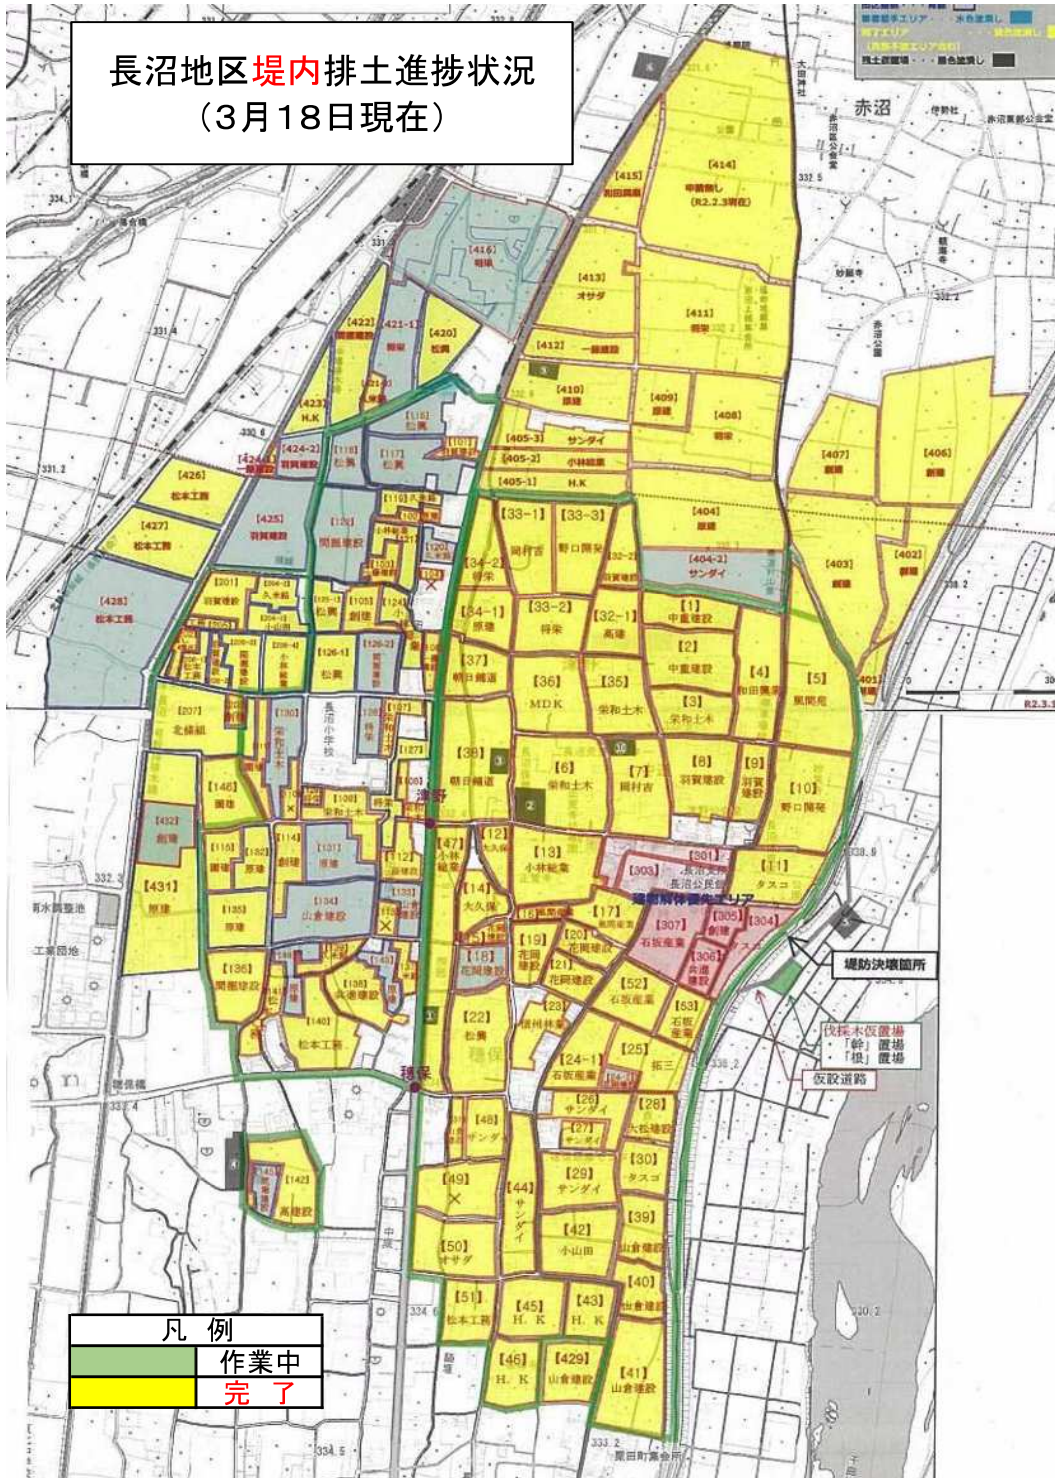

## 重点地区排土進捗率の推移

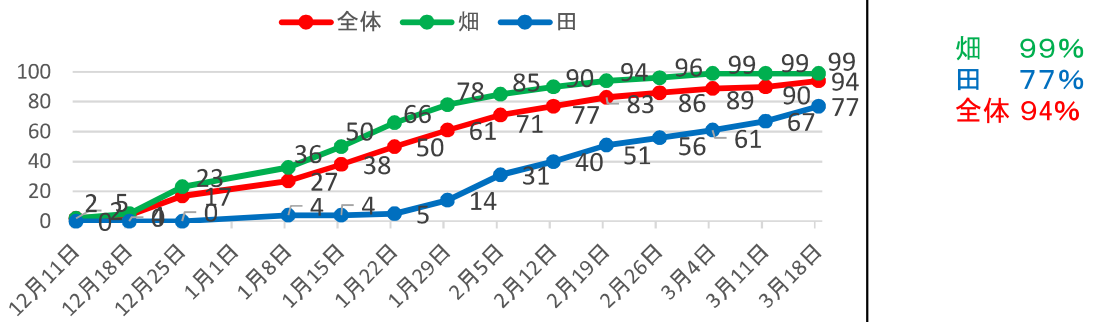

長沼地区堤外排土進捗状況  
(3月18日現在)

