

市役所本庁舎施設改修事業

◆事業内容

本庁舎のユニバーサルデザインを促進し、来庁者の利便性を向上させるための施設改修のほか、市民が気軽に市役所に立ち寄り市役所を身近に感じてもらえるような空間づくりを進める。

◆主な事業

1 ユニバーサルデザインに配慮した施設への改修

- (1) 行き先案内表示（通路）の整備
- (2) 第一庁舎通路への手すり設置
- (3) 広場駐車場車寄せへの屋根の設置
- (4) 本庁舎駐輪スペースの整理

2 市民に身近に感じてもらうための庁舎魅力アップに向けた改修

- (5) 本庁舎内通路への芸術作品展示用設備の設置
- (6) 桜スクエアへの休憩器具の設置
- (7) キッズスペースの設置

3 その他の環境整備

- (8) 清掃ロボットの導入

(1) 行き先案内表示（通路）の整備

- ① 庁舎2階連絡通路の床面等にこども総合支援センターや第一・二庁舎への行き先案内表示を整備

■連絡通路：防滑性床材に張替

- ② 市民アンケートを実施の上、トイレ等の案内表示を改善

■8月完成予定

〔通路床面等への案内表示のイメージ〕



■12月完成予定

〔トイレ等案内表示のイメージ〕





来庁者が多い階（1階、2階、7階）の通路に手すりを設置



■ 9月完成予定

〔手すりの設置イメージ〕

第一庁舎1階 ▲ N

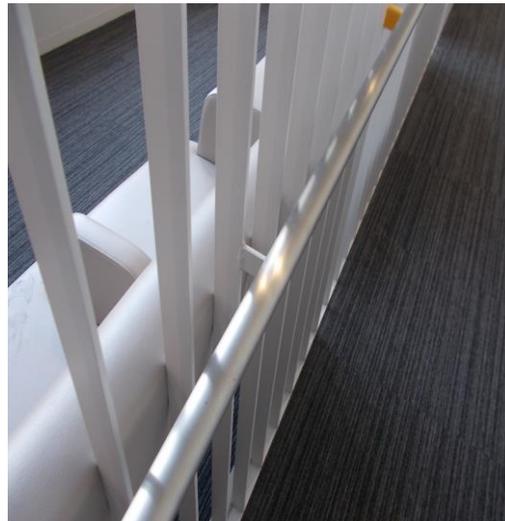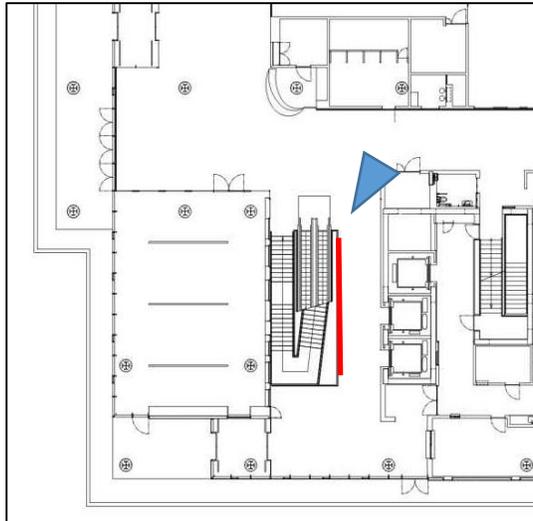



第一庁舎7階 ▲ N

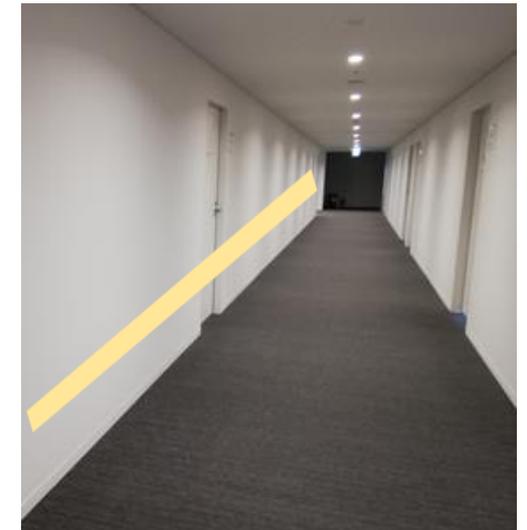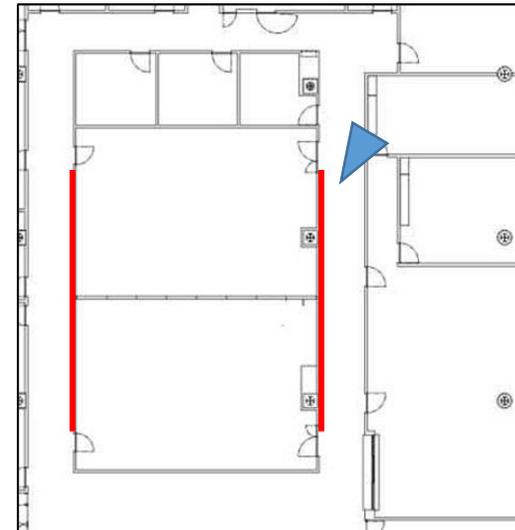

降雨・降雪時における車両乗降者の利便性確保のため車寄せへ屋根を設置

■12月完成予定

〔設置イメージ〕
屋根

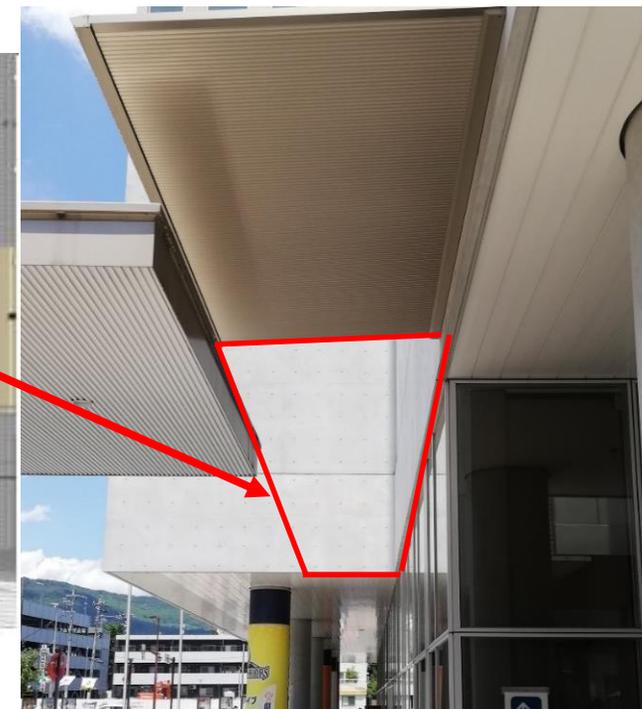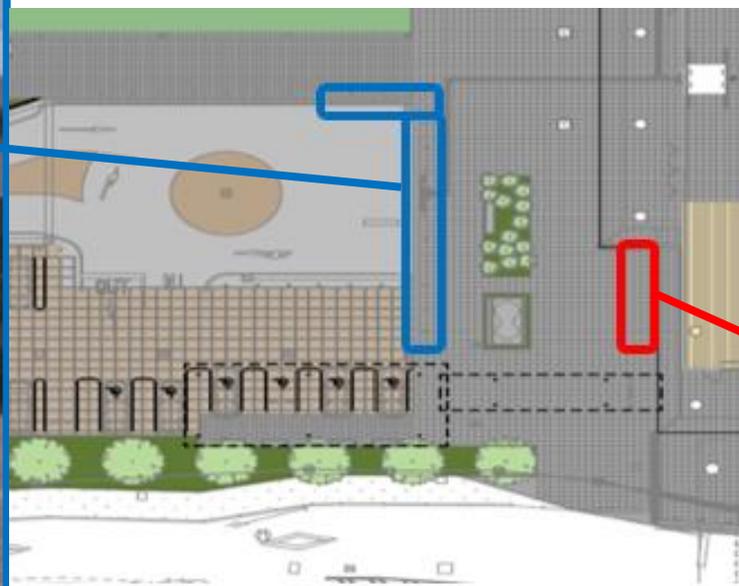

駐輪スペースの区画塗装、サイクルラックの設置

■ 8月完成予定

〔駐輪スペース区画塗装イメージ〕



■ 11月完成予定

〔サイクルラック設置イメージ〕



市所有の絵画や市民作品を展示するための設備やスペースの設置

■11月完成予定

○設置物

- ・ピクチャーレール、照明器具、マグネット・鉄製プレート
- ・美術作品展示説明板
- ・ショーケース


○美術館になぞらえた整備

〔設置箇所〕

- ・第一庁舎1階～8階のエレベーター前
- ・庁舎連絡通路（2階）



〔参考：豊島区役所〕



市民の憩いの場として広場の活用の幅を広げるため、テーブル、チェア、日よけパラソルなどの器具を設置

■ 8月設置予定

〔設置イメージ〕

〔チェア/コット〕



〔日よけパラソル〕



第一庁舎1階の待ち合わせスペースや桜スクエア利用者の子どもが一時的に利用できる専用スペースを設置


○面積 約21㎡(間口4.8m×奥行4.4m)

○避難用出入口付近に設置するため、取り外し可能なパーティション、床材を使用

■10月設置予定



〔キッズスペースイメージ〕

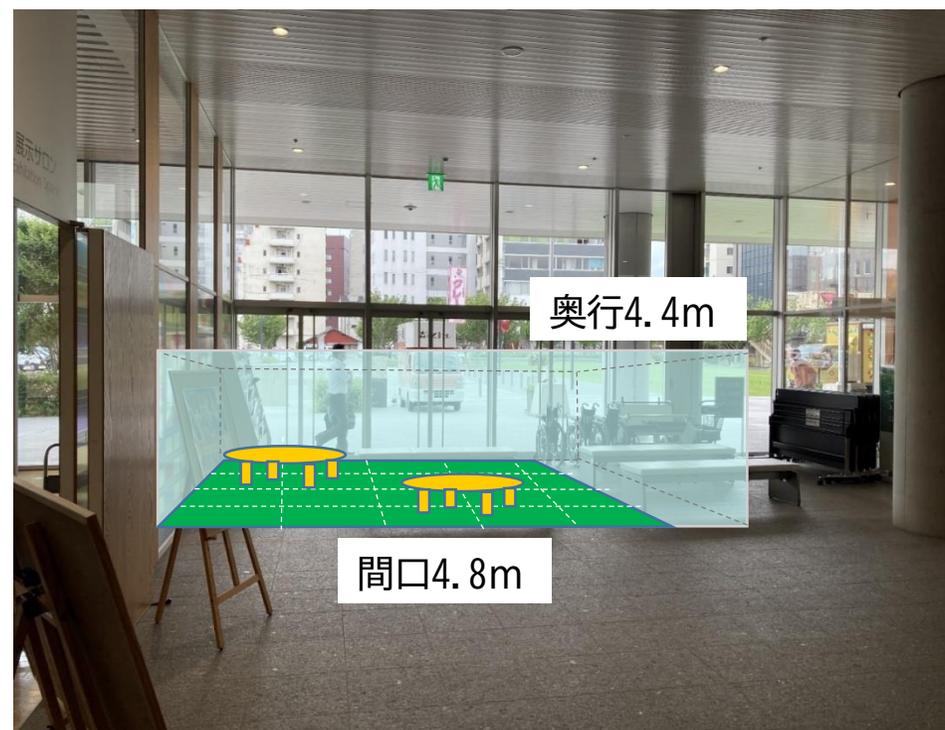

清掃業務の省力化を図るため清掃ロボットを導入

官公庁(都庁、港区役所、相模原市役所 など)
 ・その他民間施設(金融機関・医療施設・ホテル など)に導入

**長野県内自治体で
本市が初導入**



アイリスオーヤマ製
 高さ66cm×幅47cm×奥行48cm

(1) 本格導入開始日 令和5年7月31日(月)

7月は試行のため、エリア・時間を順次拡大(下表のとおり)

清掃エリア	時間	実施週(7月)
① 第一庁舎 8階	8:00~9:30	1週目
② 第一庁舎 1階	9:30~11:00	2週目
③ 2階連絡通路	16:00~17:30	3週目
④ 第二庁舎 10階	17:30~19:00	4週目
⑤ 第二庁舎 9-2階の共用部・1F	24:00~3:00	4週目



① 一庁8階



② 一庁1階



⑤ 二庁1階

【例】

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7
① 一庁8階	② 一庁1階							③ 2階連絡通路	④ 二庁10階							⑤ 二庁9-2階の共用部・1階							
充電 (5h)								充電 (5h)								充電 (5h)							

(2)清掃ロボットの性能

<p>清掃能力</p>	<p>約500㎡/時間（テニスコート2面分） ※OA床、石床、カーペットなどあらゆる床に対応</p>
<p>安全機能</p>	<p>障害物検知 ※衝突防止センサー搭載</p>



(実際の清掃の様子)

全体スケジュール

	主な事業	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
(1)	行き先案内表示(通路)の整備	工期 (通路)		アンケート調査 (トイレ等)	→		工期 (トイレ等)		
(2)	第一庁舎通路への手すり設置			工期					
(3)	広場駐車場車寄せへの屋根の設置		工期						
(4)	本庁舎駐輪スペースの整理		工期		設置 (サイクルラック)				
(5)	本庁舎内通路への芸術作品展示用設備の設置			工期			オープン(12月~2月)		
(6)	桜スクエアへの休憩器具の設置	設置							
(7)	キッズスペースの設置				設置				
(8)	清掃ロボットの導入	試行	本稼働(7月末~)						
