


第1回変更 17事業の実施箇所

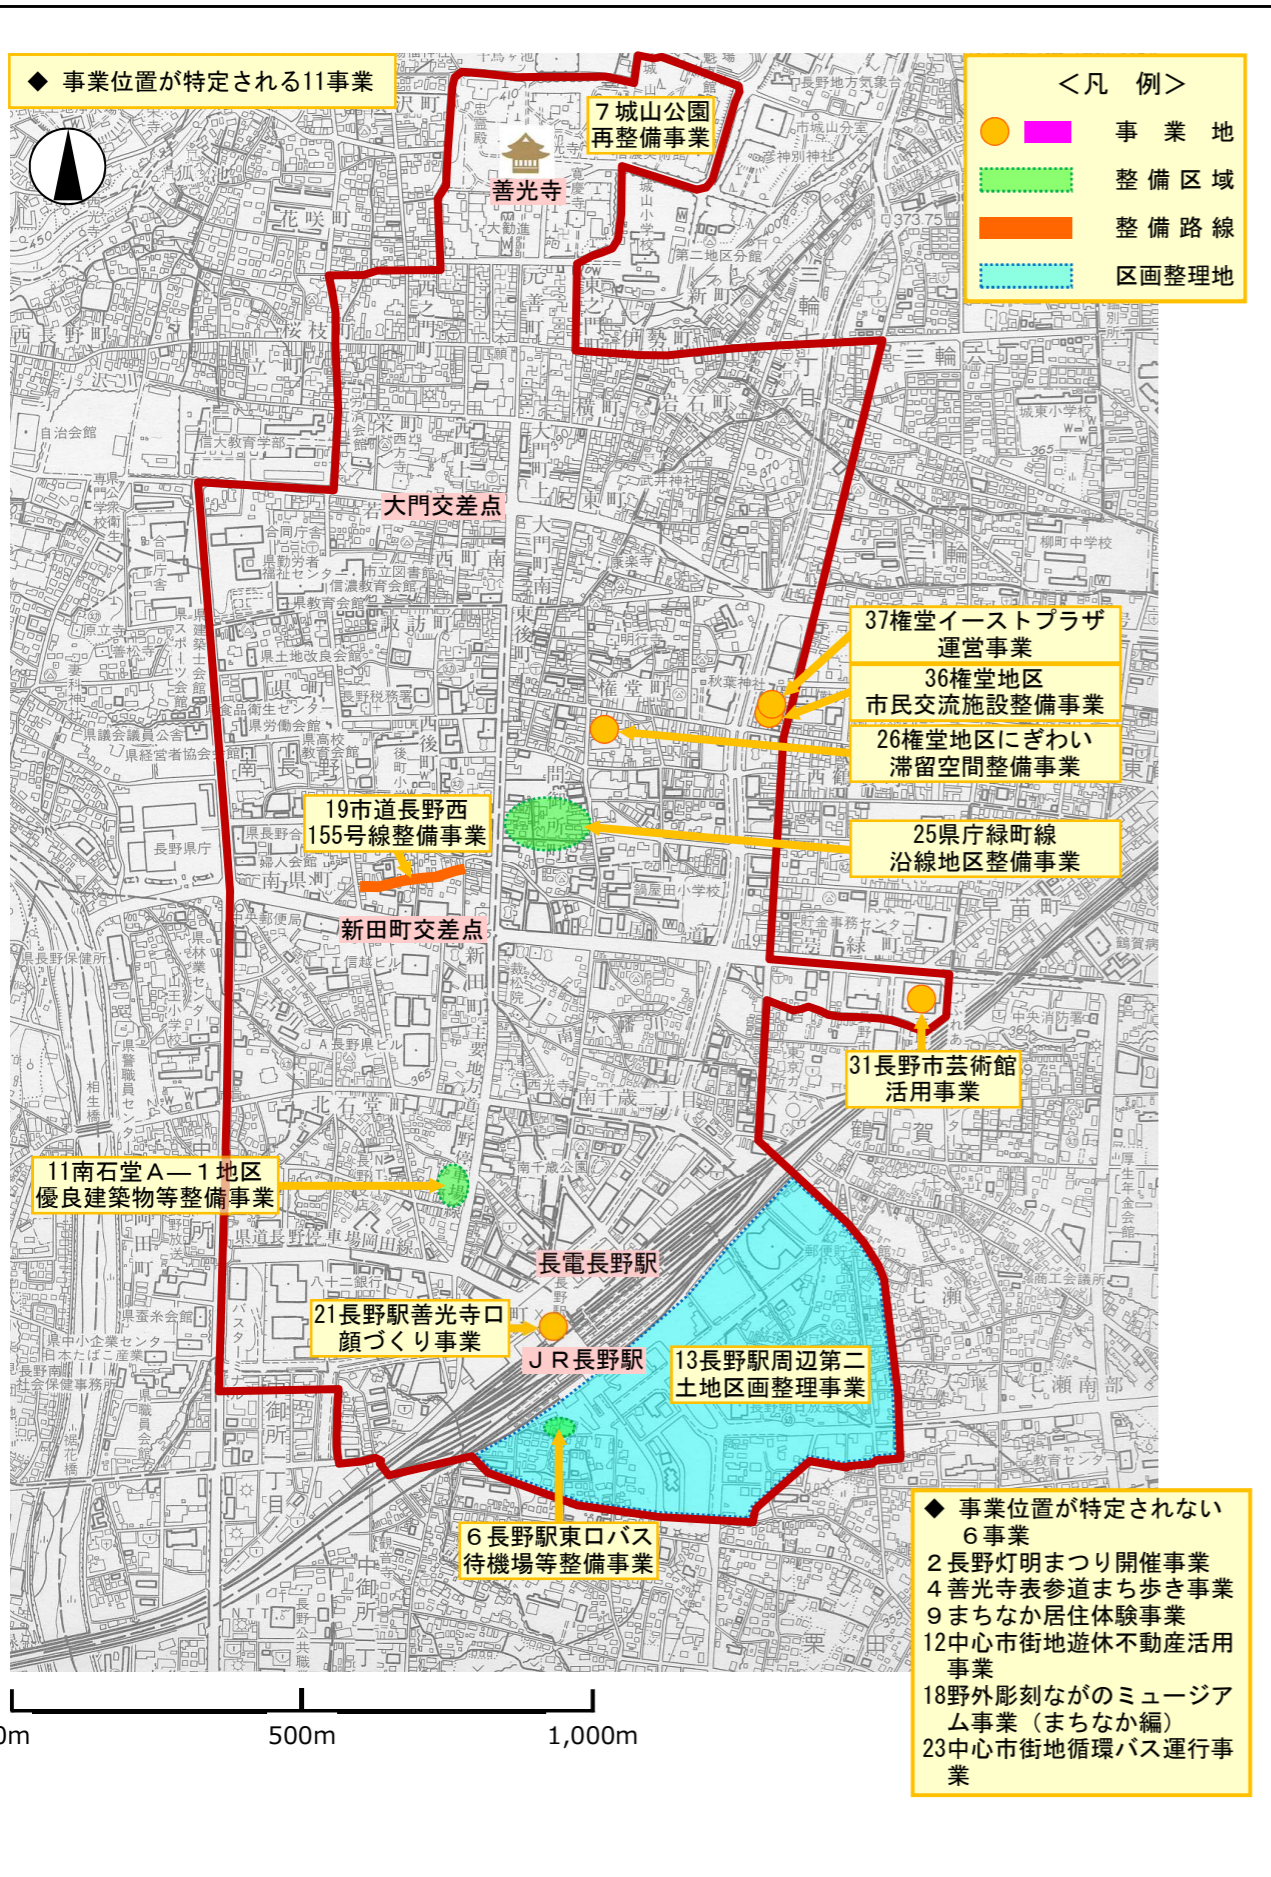

No.	事業名	変更事項・変更内容	変更理由
2	長野灯明まつり開催事業	国の支援措置の実施時期 H17～R3年度⇒H22～H28年度	国の支援措置を予定していた期間と実際に受けられた期間とが相違したため
4	善光寺表参道まち歩き事業	国の支援措置、実施時期 中心市街地活性化ソフト事業 H24～H28年度	国の支援措置を受けていたため
6	長野駅東口バス待機場等整備事業	事業実施時期 H24～H29年度⇒H24～H30年度 国の支援措置、実施時期 (長野駅周辺地区)と一体の効果促進事業 ⇒ (長野駅周辺地区)	用水組合との補償交渉及び土壌改良に不測の時間を要したため 都市再生整備計画の変更に伴い支援措置名を変更したため
7	城山公園再整備事業	国の支援措置 防災・安全交付金(都市公園・緑地等事業) H29～R2年度⇒社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(善光寺表参道地区)) H30～R2年度	都市再生整備計画の変更に伴い支援措置名を変更したため
9	まちなか居住体験事業	国の支援措置、実施時期 社会資本整備総合交付金(市街地再開発事業等と一体の効果促進事業) H23～H25年度	国の支援措置を受けていたため
11	南石堂A-1地区優良建築物等整備事業	事業実施時期、国の支援措置の実施時期 H28～R1年度⇒H28～R2年度	事業の進捗状況が予定より遅れ、事業実施時期が延びたため
12	中心市街地遊休不動産活用事業	実施主体 長野市、(株)まちづくり長野⇒中心市街地活性化協議会	実施主体のとらえ方の変更をしたもの
13	長野駅周辺第二土地区画整理事業	事業実施時期 H5～H30年度⇒H5～R5年度 国の支援措置、実施時期 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(長野駅周辺地区)) H27～R1年度 社会資本整備総合交付金(都市再生区画整理事業) H27～H30年度 社会資本整備総合交付金(道路事業(区画)) H27～R5年度 追加 ①-4 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(長野駅周辺地区)と一体の関連社会資本整備事業) ②-4 H23～R1年度	地権者との交渉に不測の時間を要したため 都市再生整備計画の変更に伴い支援措置名を変更したため 事業完了に向けて支援期間が確定したため
18	野外彫刻ながのミュージアム事業(まちなか編)	事業実施時期 H20～R3年度⇒ H29～R3年度	定期的な新規設置から必要に応じた設置へと事業内容を変更したため
19	市道長野西155号線整備事業	事業実施時期、国の支援措置の実施時期 R1～R3年度を追加	地元との調整、協議に不測の時間を要したため
21	長野駅善光寺口顔づくり事業	事業実施時期、国の支援措置の実施時期 H20～H30年度⇒H20～H26年度	事業実施時期、国の支援措置を受けた期間を修正するもの
23	市街地循環バス運行事業	事業名 中心市街地循環バス運行事業⇒市街地循環バス運行事業	将来的な運行経路見直しを見込んで事業名を変更したため
25	県庁緑町線沿線地区整備事業	国の支援措置①-1 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画(善光寺表参道地区)と一体の効果促進事業) ②-1 H24～H31年度⇒H24～H27年度 ①-2 社会資本整備総合交付金(防災・安全(街路事業)) ②-2 H28～H30 ①-3 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(善光寺表参道地区)) ②-3 R1	国の支援措置名を修正するもの
26	権堂地区にぎわい滞留空間整備事業	事業実施時期 H25～H29年度⇒H25～R3年度 国の支援措置の実施時期 H25～H29年度⇒H25～R1年度	実質的に「権堂地区市街地整備事業」の中に含まれるため実施時期を一致させるもの
31	長野市芸術館活用事業	中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性 大ホールと2つの小ホール、リハーサル室、演劇・音楽・バンド練習室、ギャラリーなど⇒大小のホールとリハーサル室、練習室やギャラリーなど	記述内容を整理したため
36	権堂地区市民交流施設整備事業	事業実施時期 H24～H29年度⇒H24～R1年度 実施主体 長野市、(株)まちづくり長野⇒長野市	実施時期を延長したため実施主体を修正するもの
37	権堂イーストプラザ運営事業	実施主体 (株)まちづくり長野⇒指定管理者	実施主体を修正するもの
